



Alcaldía Municipal  
**Pitalito Huila**

**Región que Vive**

# INFORME CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
MUNICIPIO DE PITALITO

23 DE MAYO DE 2022



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

**1. Relacione los contratos firmados y ejecutados por la Secretaría de Infraestructura desde el año 2020 a la fecha de recibida la presente notificación en un cuadro tal y como se relaciona**

**Anexo No 1. Contratación 2020**  
**Anexo No 2. Contratación 2021**  
**Anexo No 3. Contratación 2022**



En el año 2020 se realizaron un total de 33 contratos y convenios por parte de la Secretaría de Infraestructura:

| ITEM | TIPO DE CONTRATO          | Numero de Contratos | VALOR CONTRATADO            |
|------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1    | PRESTACION DE SERVICIOS   | 16                  | \$ 367.957.728              |
| 2    | OBRA                      | 5                   | \$ 18.183.021.879           |
| 3    | SUMINISTRO                | 7                   | \$ 902.000.000              |
| 4    | ALQUILER Y TRANSPOR       | 3                   | \$ 454.000.000              |
| 5    | COMPRA DE PREDIOS         | 1                   | \$ 1.504.000                |
| 6    | CONVENIOS                 | 1                   | \$ 500.000.000              |
|      | <b>TOTAL CONTRATACION</b> | <b>33</b>           | <b>\$ 19.908.483.607,70</b> |

Cabe destacar que algunas adiciones presupuestales a contratos de obra se realizaron en vigencias posteriores como por ejemplo a la Obra de Puente sobre Río Guarapas, Velódromo y Tanque Higuerón por valor total de \$ 2.013.018.799,95



En el año 2021 se realizaron un total de 69 contratos y convenios por parte de la Secretaría de Infraestructura:

| ITEM | TIPO DE CONTRATO          | Número de Contratos | VALOR CONTRATADO      |
|------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1    | PRESTACION DE SERVICIOS   | 29                  | 579.418.051           |
| 2    | OBRA                      | 14                  | 16.624.329.265        |
| 3    | SUMINISTRO                | 14                  | 1.852.871.840         |
| 4    | ALQUILER Y TRANSPORTE     | 2                   | 81.600.000            |
| 5    | INTERVENTORÍA             | 5                   | 1.189.561.856         |
| 6    | CONVENIOS                 | 5                   | 2.624.999.363         |
|      | <b>TOTAL CONTRATACION</b> | <b>69</b>           | <b>22.952.780.374</b> |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| "TERMINACION CONSTRUCCION VELODROMO CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA"   | 96.257.401,00           |
| CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO ACCESO Y PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CARRERA 6 SOBRE EL RÍO GUARAPAS EN EL BARRIO LIBERTADOR MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA"  | 1.910.833.422,00        |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO Y CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA HIGUERON, CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO, MUNICIPIO DE PITALITO HUILA | 5.927.976,95            |
|  | <b>2.013.018.799,95</b> |



| No contrato   | objeto  | contratista   | valor inicial    | adicion | valor final      | acta de inicio | fecha de terminacion | valor interventoria | PORCENTA JE DE EJECUCION |
|---|---|---|------------------|---------|------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 044 de 2021 | LA REALIZACION A TODO COSTO DE AVALUOS DE DISTINTOS INMUEBLES CON DESTINO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANISTICA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.  | LONJA PRECOOPERATIVA DE AVALUADORES Y SERVICIOS PROFESIONALES LTD | \$ 40.800.000,00 |         | \$ 40.800.000,00 | 2/08/2021      |                      | \$ -                | 0%                       |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 294 DE 2021     | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA, PARA LA GESTION DE ADQUISICION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO         | CAMILO CHAUX OSORIO   | \$ 10.500.000,00 |         |                  | 12/08/2022     |                      | \$ -                | 0%                       |
| CONVENIO No.034 2021                                | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO Y EMPRESAS PUBLICAS DE PITALITO EMPITALITO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR LATERAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR QUEBRADA EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA | EMPITALITO E.S.P.   | \$ 600.000.000   |         |                  | 30/09/2021     | 30/03/2022           | \$ -                | 0%                       |
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.281 DE 2021             | CONSTRUCCION BOCATOMA, DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELLA VISTA CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA FASE I                                       | EMPITALITO E.S.P.   | \$148.192.262    | \$ -    |                  | 10/06/2021     |                      | \$ -                | 0%                       |
| CONTRATO DE M.C. 059-2021                           | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EXTERNA DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  | PROSPECTIVA INGENIEROS S.A.S                                      | \$ 22.498.780,00 |         |                  | 3/11/2021      |                      | \$ -                | 0%                       |

**Ejecución 2022**

**Ejecución 2022**

**Ejecución 2022**

**Liquidación  
Bilateral  
Nuevo Proceso de  
contratación**

**Proceso  
Incumplimiento  
Nuevo Proceso de  
Contratación**



En lo corrido de la vigencia del año 2022 se realizaron un total de 32 contratos y convenios por parte de la Secretaría de Infraestructura:

| ITEM | TIPO DE CONTRATO          | Número de Contratos | VALOR CONTRATADO        |
|------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1    | PRESTACION DE SERVICIOS   | 20                  | 366.120.000,00          |
| 2    | OBRA                      | 4                   | 2.124.696.678,00        |
| 3    | SUMINISTRO                | 6                   | 493.000.000,00          |
| 4    | ALQUILER Y TRANSPORTE     | 2                   | 89.999.923,86           |
|      | <b>TOTAL CONTRATACION</b> | <b>32</b>           | <b>3.073.816.601,86</b> |

Cabe destacar que algunas adiciones presupuestales a contratos de obra se realizaron en vigencias posteriores



# 2 ■ **Relacione el estado actual de la maquinaria Amarilla y su ruta de trabajo en el presente mes de mayo y junio del presente año**



# Estado de Maquinaria Amarilla

## Contratos de Apoyo

- Suministro de Combustible
- Suministro Repuestos y Mano de obra para Mantenimiento y Reparaciones
- Suministro de Llantas
- Recebo desde Cantera
- Alquiler de Volquetas
- Alquiler de Maquinaria

| #  | Nombre Máquina         | Marca/Modelo   | INFORMACION PARA EL CONTRATO COMBUSTIBLE                                | Estado |         |      | Observaciones         | ESTADO   |
|----|------------------------|--|---|--------|---------|------|-----------------------|--|
|    |                        |  |   | Bueno  | Regular | Malo |                       |  |
| 1  | BULLDOZER              | JHON DEERE - MODELO 550K                               | BULLDOZER JHON DEERE - MODELO 550K                                      | X      |         |      | Antigua               | OPERATIVA  |
| 2  | MOTONIVELADORA         | JOHN DEERE - MODELO 670GB                              | MOTONIVELADORA JOHN DEERE - MODELO 670GB                                | X      |         |      | Antigua               | NO OPERATIVA<br>Requiere Intervención Reparación |
| 3  | MOTONIVELADORA - 10503 | KOMATSU - MODELO GD 611A                               | MOTONIVELADORA - 10503 KOMATSU - MODELO GD 611A                         | X      |         |      | Antigua               | OPERATIVA  |
| 4  | RETROEXCAVADORA        | JCB - MODELO 3C  | RETROEXCAVADORA JCB - MODELO 3C   |        | X       |      | Antigua               | NO OPERATIVA<br>Requiere Intervención Reparación |
| 5  | VIBROCOMPACTADOR       | CATERPILAR - MODELO 1990                               | VIBROCOMPACTADOR CATERPILAR - MODELO 1990                               |        | X       |      | Antigua               | OPERATIVA<br>Requiere Intervención Mínima        |
| 6  | MOTONIVELADORA         | CASE 845B/MODELO 2019 Placa MC106929 SERIAL NKA07503   | MOTONIVELADORA CASE 845B/MODELO 2019 Placa MC106929 SERIAL NKA07503     | X      |         |      | Adquirida en 2019     | OPERATIVA  |
| 7  | MOTONIVELADORA         | CASE 845B/MODELO 2019 Placa MC106002 SERIAL NKA07603   | MOTONIVELADORA CASE 845B/MODELO 2019 Placa MC106002 SERIAL NKA07603     | X      |         |      | Adquirida en 2019     | OPERATIVA  |
| 8  | RETROCARGADOR          | CASE 580SN/MODELO 2020 Placa MC105483 SERIAL 3572      | RETROCARGADOR CASE 580SN/MODELO 2020 Placa MC105483 SERIAL 3572         | X      |         |      | Adquirida en 2019     | OPERATIVA  |
| 9  | RETROCARGADOR          | CASE 580SN/MODELO 2020 Placa MC105484 SERIAL 3575      | RETROCARGADOR CASE 580SN/MODELO 2020 Placa MC105484 SERIAL 3575         | X      |         |      | Adquirida en 2019     | OPERATIVA  |
| 10 | VIBROCOMPACTADOR       | AMMANN ASC 70/MODELO 2018 Placa MC106676 SERIAL 274507 | VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70/MODELO 2018 Placa MC106676 SERIAL 274507 | X      |         |      | Adquirida en 2019     | OPERATIVA  |
| 11 | VIBROCOMPACTADOR       | AMMANN ASC 70/MODELO 2018 Placa MC88110 SERIAL 2742497 | VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70/MODELO 2018 Placa MC88110 SERIAL 2742497 | X      |         |      | Adquirida en 2019     | OPERATIVA  |
| 12 | VOLQUETA               | HINO 500 OJZ075  | VOLQUETA HINO 500 OJZ075  | X      |         |      | Adquirida en 2019     | OPERATIVA  |
| 13 | VOLQUETA               | HINO 500 OJZ076  | VOLQUETA HINO 500 OJZ076  | X      |         |      | Adquirida en 2019     | OPERATIVA  |
| 14 | VOLQUETA               | HINO 500 OJZ077  | VOLQUETA HINO 500 OJZ077  | X      |         |      | Adquirida en 2019     | OPERATIVA  |
| 15 | VOLQUETA               | HINO 500 OJZ078  | VOLQUETA HINO 500 OJZ078  | X      |         |      | Adquirida en 2019     | OPERATIVA  |
| 16 | RETROEXCAVADORA        | JHON DEERE - MODELO 410K                               |   |        |         | X    | Antigua en reparación | NO OPERATIVA<br>Requiere Intervención Reparación |



# Atención de Derrumbes y Afectaciones viales 2021

| ATENCION A DERRUMBES VIGENCIA 2021 | ENERO    | FEBRERO  | MARZO     | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | JULIO     | AGOSTO    | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Total Atencion a Derrumbes |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|----------------------------|
| <b>RURAL</b>                       | 5        | 9        | 71        | 26        | 11        | 36        | 44        | 21        | 5          | 2        | 12        | 22        | 264                        |
| BRUSELAS                           | 5        | 6        | 32        | 22        | 4         | 17        | 18        | 17        | 2          |          | 11        | 17        | 151                        |
| CHARGUAYACO                        |          | 1        | 6         |           | 1         | 7         | 11        |           |            | 1        |           | 3         | 30                         |
| CHILLURCO                          |          |          | 11        |           |           | 1         | 1         | 1         | 1          |          |           |           | 15                         |
| GUACACALLO                         |          | 2        | 15        | 3         |           |           |           |           |            |          |           |           | 20                         |
| LA LAGUNA                          |          |          | 1         |           |           | 1         |           |           |            |          |           | 1         | 3                          |
| PALMARITO                          |          |          | 1         |           | 6         | 6         | 7         | 1         |            |          |           | 1         | 22                         |
| REGUEROS                           |          |          | 5         |           |           | 3         |           |           |            |          |           |           | 8                          |
| CRIOLLO                            |          |          |           | 1         |           | 1         | 7         | 1         | 1          |          | 1         |           | 12                         |
| 2 COMUNA                           |          |          |           |           |           |           |           | 1         | 1          | 1        |           |           | 3                          |
| <b>Total Atencion a Derrumbes</b>  | <b>5</b> | <b>9</b> | <b>71</b> | <b>26</b> | <b>11</b> | <b>36</b> | <b>44</b> | <b>21</b> | <b>5</b>   | <b>2</b> | <b>12</b> | <b>22</b> | <b>264</b>                 |



# Atención de Derrumbes y Afectaciones viales 2022



| ATENCIÓN A DERRUMBES<br>VIGENCIA 2021 | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | ABRIL    | Total<br>Atención a<br>Derrumbes |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| <b>RURAL</b>                          | <b>10</b> | <b>12</b> | <b>52</b> | <b>8</b> | <b>82</b>                        |
| BRUSELAS                              |           | 8         | 7         | 4        | 19                               |
| CHILLURCO                             | 8         |           | 3         |          | 11                               |
| LA LAGUNA                             | 2         | 3         | 3         |          | 8                                |
| CHARGUAYACO                           |           | 1         | 11        | 1        | 13                               |
| GUACACALLO                            |           |           | 1         | 2        | 3                                |
| PALMARITO                             |           |           | 26        | 1        | 27                               |
| CRIOLO                                |           |           | 1         |          | 1                                |
| <b>Total Atención a Derrumbes</b>     | <b>10</b> | <b>12</b> | <b>52</b> | <b>8</b> | <b>82</b>                        |



# Construcción de Alcantarillas y Desagües Viales




| ALCANTARILLAS                                    |                            |                     |
|--|----------------------------|---------------------|
| PROYECTOS  | Estado                     | No de Alcantarillas |
| Municipio de Pitalito - Comité de Cafeteros 2020 | Construidas 2021           | 14                  |
| Ocad PAZ - Regalías Municipio Pitalito 2019-2020 | Construidas 2022           | 19                  |
| Municipio de Pitalito - Comité de Cafeteros 2021 | Construidas 2022           | 15                  |
| Tubería Alcantarillas 24"                        | Desagües Viales 24" (2021) | 27                  |
| Tubería Alcantarillas 36"                        | Desagües Viales 36" (2021) | 10                  |
| <b>TOTAL</b>                                     |                            | <b>85</b>           |




# Red Vial Municipal

DATOS RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA LONGITUD (Km)

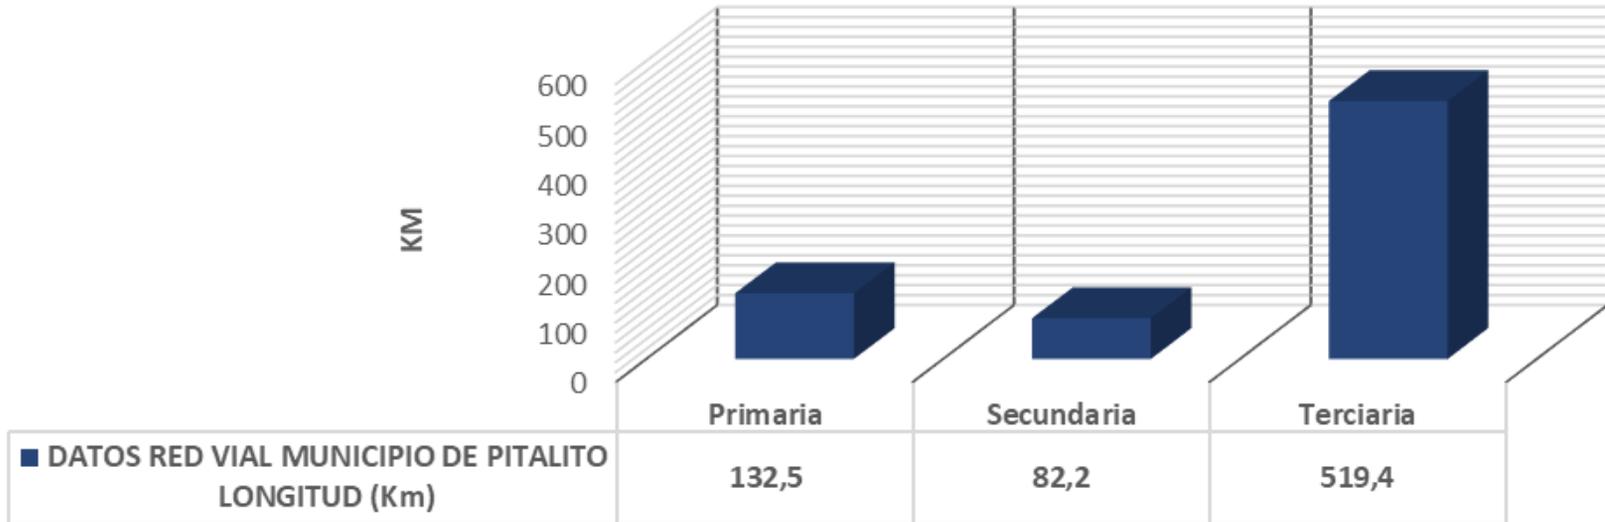

# Red Vial Municipal

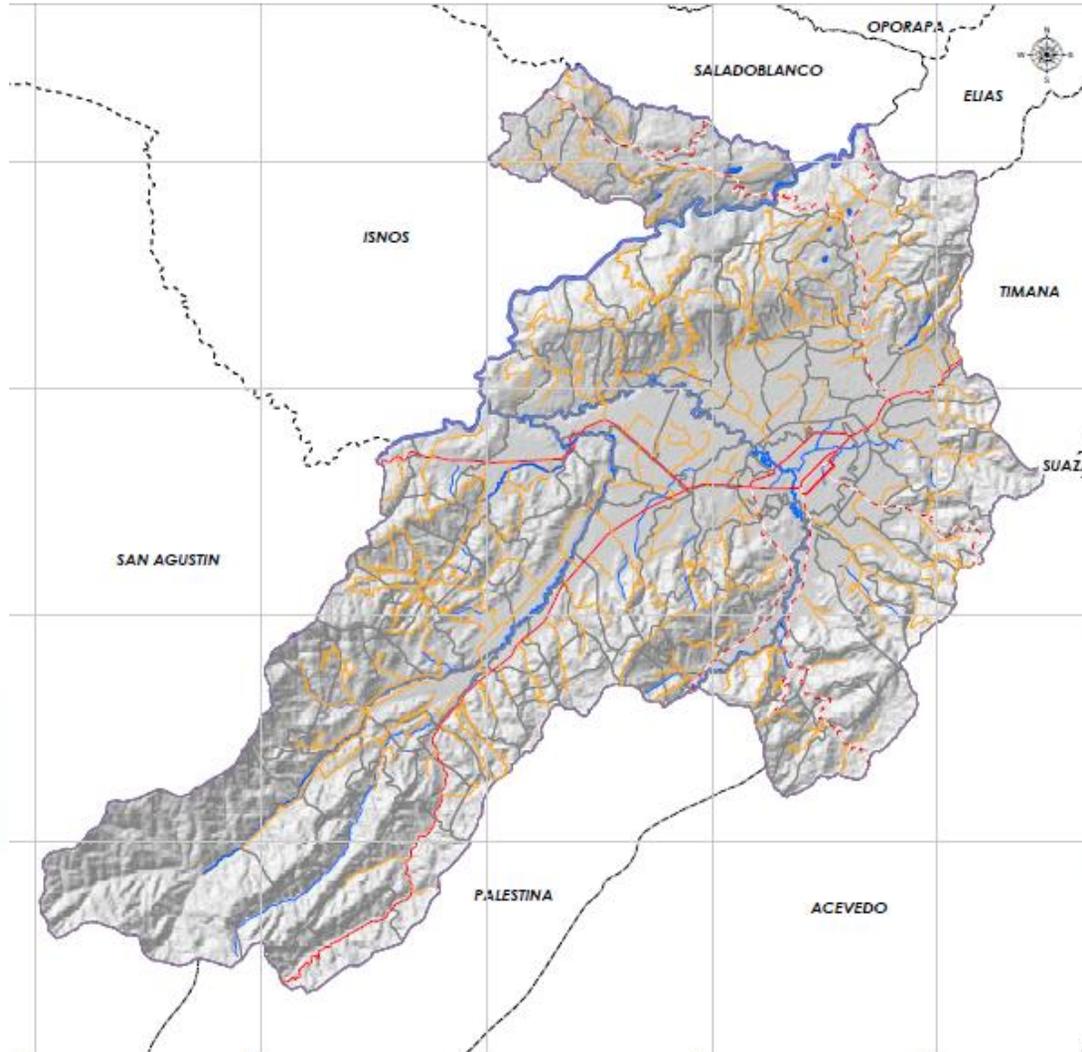


**Municipio de Pitalito Huila**  
**Región que Vive**  
 Plan de Desarrollo Municipal 2023-2027 Pitalito Huila, Región que Vive  
**RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA**

**RESUMEN**

**OBJETIVO**


**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

Elaboración de la Red Vial Municipal del Municipio de Pitalito Huila, Departamento de Huila.

| INDICADORES     |       | VALORES |       |
|-----------------|-------|---------|-------|
| Área de Estudio | 1.200 | 1.200   | 1.200 |
| Extensión       | 1.200 | 1.200   | 1.200 |
| Extensión       | 1.200 | 1.200   | 1.200 |
| Extensión       | 1.200 | 1.200   | 1.200 |
| Extensión       | 1.200 | 1.200   | 1.200 |

**COORDINADAS GEOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA**

| COORDINADAS GEOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA | COORDINADAS GEOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA |
|---|---|
| Latitud   | 4° 30' N  |
| Longitud  | 75° 30' W   |



**INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA**

| SISTEMA DE REFERENCIA           | INFORMACIÓN TÉCNICA                                  |
|---------------------------------|--|
| Base cartográfica no deformable | Elaboración y actualización de la red vial municipal |
| Proyección                      | Escala de Producción 1:25.000                        |
| Formato de Producción           | Formato de Producción                                |
| Formato de Producción           | Formato de Producción                                |

**MAPA:** Hoja 01 de 04

**CONTENIDO:** Red Vial Municipal de Pitalito Huila

**ELABORADO:** Proceso de Producción y Coordinación FVMS

**REVISADO:** Oficina de Planeación y Desarrollo Económico

**COORDINADO:** Oficina de Planeación y Desarrollo Económico

**INFORMACIÓN DE INFERIORIDAD:** De Julio - Año 2021



# Red Vial Municipal

Invias



Concesión Ruta AL SUR S.A.S.

# Reportes Diarios de Mantenimientos

Fuente: Informes reportados por los Inspectores de Vías: Sr. Luis Bernardo Portilla y Sr. Humberto Ordoñez

| FECHA      | MES   | SECTOR | COMUNA / CORREGIMIENTO | BARRIO / VEREDA | DETALLE   | Avance mantenimiento | Apertura de vías | TOTAL AVANCE MANTENIMIENTO | Material sobrante |
|------------|-------|--------|------------------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 4/01/2022  | ENERO | URBANO | 4 COMUNA               | SOLARTE         | [6:51 p. m., 4/1/2022] Bernardo Inspector: informe del día 4. /01/ del 2022, Barrio solarte comuna, 4 se realizo ampliación y se recogieron 134,mts de material sobrante. de la carrera 6 entre calles 18,sur calle 19,sur y calle 19,A sur frente al Inspector con avance de 140,mts                                 | 140                  |                  | 140                        | 134               |
| 5/01/2022  | ENERO | URBANO | 4 COMUNA               | SOLARTE         | [8:15 p. m., 5/1/2022] Bernardo Inspector: barrio solarte comuna. 4, limpieza conformación de cunetas suministro de recebo extendido y perfilado de la vía principal a inpec avance 250,mts   | 250                  |                  | 250                        |                   |
| 5/01/2022  | ENERO | RURAL  | CHARGUAYACO            | EL HIGUERON     | [8:10 p. m., 5/1/2022] Bernardo Inspector: Informe del día.5/01/ del 2022, corregimiento de chaguayaco vereda higerón, se inicio y se termino con limpieza conformación de cunetas suministro de recebo extendido y perfilado de un ramal que beneficia a 8, familias avance 800,mts , la comunidad aporó 2 volquetas | 800                  |                  | 800                        |                   |
| 6/01/2022  | ENERO | RURAL  | CHILLURCO              | MIRAVALLE       | [8:24 p. m., 6/1/2022] Bernardo Inspector: corregimiento de chillurco vereda Miravalle, limpieza conformación de cunetas perfilado y ampliación de 200, mts lineales de la vía principal para la construcción de una placa huella   | 200                  |                  | 200                        |                   |
| 7/01/2022  | ENERO | RURAL  | CHARGUAYACO            | PARAISO         | [7:46 p. m., 7/1/2022] Bernardo Inspector: corregimiento de chaguayaco vereda paraíso, Ampliación limpieza conformación de cunetas y perfilado de 100,mts de la vía principal para la construcción de una placa huella  | 100                  |                  | 100                        |                   |
| 7/01/2022  | ENERO | URBANO | 2 COMUNA               | VILLA SOFIA     | [7:52 p. m., 7/1/2022] Bernardo Inspector: entre el barrio sucre norte y la urbanización villas Sofia comuna 2, ampliación conformación de cunetas replanteo y perfilado de la.calle 25 avance 400,mts  | 400                  |                  | 400                        |                   |
| 11/01/2022 | ENERO | RURAL  | LA LAGUNA              | LA FLORIDA      | [7:23 p. m., 11/1/2022] Bernardo Inspector: corregimiento de la Laguna vereda la Florida, se ampliaron 60,mts lineales de la vía principal y se hizo una Zanja para recoger aguas llluvias al margen izquierda de la misma vía con avance de 80,mts   | 140                  |                  | 140                        |                   |
| 11/01/2022 | ENERO | RURAL  | REGUEROS               | EL GUALMAL      | [5:18 p. m., 11/1/2022] Humberto Inspector: Corregimiento de Regueros, vereda EL. GUAMAL, Conformación de cunetas, perfilado y extendido de un viaje de recebo. Avance 400 mts.   | 400                  |                  | 400                        |                   |
| 11/01/2022 | ENERO | RURAL  | GUACACALLO             | PARAISO         | [7:13 p. m., 11/1/2022] Bernardo Inspector: informe del día 11/01/2022, corregimiento de guacacallo vereda paraíso la palma se inicio con limpieza conformación de cunetas y perfilado de la vía principal avance 600,mts   | 600                  |                  | 600                        |                   |



# Mantenimiento de vías 2020

## MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

PERIODO: DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| COMUNAS   | TOTAL                         | # CUADRAS INTERVENIDAS          |                                   |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| COMUNA 1  | 25.580 Metros Lineales        | 284                             |                                   |
| COMUNA 2  | 34.690 Metros Lineales        | 385                             |                                   |
| COMUNA 3  | 10.430 Metros Lineales        | 116                             |                                   |
| COMUNA 4  | 26.640 Metros Lineales        | 296                             |                                   |
| <b>Total general</b>                              | <b>97.340 Metros Lineales</b> | <b>1.082</b>                    |                                   |
| <b>META PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2020</b> |                               | <b>EJECUTADO AÑO 2020</b>       |                                   |
| <b>75.000</b> Metros Lineales                     | <b>97.340</b> Metros Lineales | <b>833</b> CUADRAS INTERVENIDAS | <b>1.082</b> CUADRAS INTERVENIDAS |

**130%**  
EJECUTADO

## MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

PERIODO: DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| CORREGIMIENTOS       | TOTAL METROS   | TOTAL KM   |
|----------------------|----------------|------------|
| BRUSELAS             | 87.739         | 88         |
| CHARGUAYACO          | 54.467         | 54         |
| CHILLURCO            | 22.770         | 23         |
| CRIOLLO              | 30.414         | 30         |
| GUACACALLO           | 13.675         | 14         |
| LA LAGUNA            | 53.572         | 54         |
| PALMARITO            | 18.981         | 19         |
| REGUEROS             | 101.033        | 101        |
| <b>Total general</b> | <b>382.650</b> | <b>383</b> |

| <b>META PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AÑO 2020</b> |                                | <b>EJECUTADO AÑO 2020</b> |                       |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>300.000</b> Metros Lineales                    | <b>382.650</b> Metros Lineales | <b>300</b> Kilometros     | <b>383</b> Kilometros |

**128%**  
EJECUTADO



# Mantenimiento de vías 2021

**EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VIAS URBANO  
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  
PERIODO: DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

| COMUNAS              | TOTAL EN METROS LINEALES | # CUADRAS INTERVENIDAS |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| COMUNA 1             | 22.642                   | 252                    |
| COMUNA 2             | 25.962                   | 288                    |
| COMUNA 3             | 2.750                    | 31                     |
| COMUNA 4             | 24.834                   | 276                    |
| REPARCHEO            | 3.861                    | 43                     |
| <b>Total general</b> | <b>80.049</b>            | <b>889</b>             |

| EJECUCION DE MANTENIMIENTO URBANO | En Metros Lineales | En # de Cuadras Intervenidas |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| META DEL PDM                      | <b>75.000</b>      | <b>833</b>                   |
| EJECUTADO 2021                    | <b>80.049</b>      | <b>889</b>                   |
| <b>% DE AVANCE</b>                | <b>106,73%</b>     |                              |

**EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VIAS RURAL  
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  
PERIODO: DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

| CORREGIMIENTOS       | TOTAL METROS LINEALES | TOTAL KILOMETROS |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| BRUSELAS             | 108.008               | 108              |
| CHARGUAYACO          | 44.041                | 44               |
| CHILLURCO            | 83.280                | 83               |
| CRIOLLO              | 83.635                | 84               |
| GUACACALLO           | 32.590                | 33               |
| LA LAGUNA            | 10.300                | 10               |
| PALMARITO            | 36.320                | 36               |
| REGUEROS             | 12.207                | 12               |
| REPARCHEO            | 2                     | 0                |
| <b>Total general</b> | <b>410.383</b>        | <b>410</b>       |

| EJECUCION DE MANTENIMIENTO RURAL | En Metros Lineales | En Kilometros |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| META DEL PDM                     | <b>300.000</b>     | <b>300</b>    |
| EJECUTADO 2021                   | <b>410.383</b>     | <b>410,38</b> |
| <b>% DE AVANCE</b>               | <b>136,79%</b>     |               |



# Mantenimiento de vías 2021

EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VIAS URBANO  
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  
PERIODO: DEL 4 DE ENERO AL 13 DE MAYO DEL 2022

| COMUNAS              | TOTAL EN METROS LINEALES | # CUADRAS INTERVENIDAS |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| COMUNA 1             | 10.991                   | 122                    |
| COMUNA 2             | 20.310                   | 226                    |
| COMUNA 3             | 1.300                    | 14                     |
| COMUNA 4             | 13.790                   | 153                    |
| REPARCHEO            | 6.935                    | 77                     |
| <b>Total general</b> | <b>53.326</b>            | <b>593</b>             |

| EJECUCION DE MANTENIMIENTO URBANO | En Metros Lineales | En # de Cuadras Intervenidas |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| META DEL PDM                      | 75.000             | 833                          |
| EJECUTADO 2021                    | 53.326             | 593                          |
| <b>% DE AVANCE</b>                | <b>71,10%</b>      |                              |

EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE VIAS RURAL  
MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  
PERIODO: DEL 4 DE ENERO AL 13 DE MAYO DEL 2022

| CORREGIMIENTOS       | TOTAL METROS LINEALES | TOTAL KILOMETROS |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| BRUSELAS             | 59.155                | 59               |
| CHARGUAYACO          | 9.120                 | 9                |
| CHILLURCO            | 39.440                | 39               |
| CRIOLLO              | 27.550                | 28               |
| GUACACALLO           | 8.750                 | 9                |
| LA LAGUNA            | 510                   | 1                |
| PALMARITO            | 12.020                | 12               |
| REGUEROS             | 4.550                 | 5                |
| REPARCHEO            |                       | -                |
| <b>Total general</b> | <b>161.095</b>        | <b>161</b>       |

| EJECUCION DE MANTENIMIENTO RURAL | En Metros Lineales | En Kilometros |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| META DEL PDM                     | 300.000            | 300           |
| EJECUTADO 2021                   | 161.095            | 161,10        |
| <b>% DE AVANCE</b>               | <b>53,70%</b>      |               |

ALCALDIA DE PITALITO HUILA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
INFORME DETALLADO POR MES DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO  
CORTE DEL 4 DE ENERO AL 13 DE MAYO/2022

## VIGENCIA 2022

| Suma de TOTAL AVANCE MANTENIMIENTO | Metros lineales |               |               |               |               |                |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sector                             | ENERO           | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | TOTAL          |
| <b>RURAL</b>                       | 32.300          | 45.965        | 45.510        | 21.480        | 15.840        | 161.095        |
| BRUSELAS                           | 1.370           | 26.815        | 14.920        | 11.810        | 4.240         | 59.155         |
| CHARGUAYACO                        | 900             | 3.400         | 3.820         | 1.000         |               | 9.120          |
| CHILLURCO                          | 19.040          | 10.800        | 9.600         |               |               | 39.440         |
| CRIOLLO                            | 1.500           | 1.200         | 13.200        | 2.650         | 9.000         | 27.550         |
| GUACACALLO                         | 3.350           |               | 2.400         | 1.600         | 1.400         | 8.750          |
| LA LAGUNA                          | 440             |               | 70            |               |               | 510            |
| PALMARITO                          | 1.300           | 3.600         | 1.500         | 4.420         | 1.200         | 12.020         |
| REGUEROS                           | 4.400           | 150           |               |               |               | 4.550          |
| <b>URBANO</b>                      | 890             | 9.250         | 12.881        | 20.325        | 9.980         | 53.326         |
| 1 COMUNA                           |                 | 4.200         | 2.301         | 2.820         | 1.670         | 10.991         |
| 2 COMUNA                           | 400             | 200           | 1.200         | 10.450        | 8.060         | 20.310         |
| 3 COMUNA                           |                 |               | 100           | 1.200         |               | 1.300          |
| 4 COMUNA                           | 490             | 4.850         | 3.500         | 4.700         | 250           | 13.790         |
| REPARCHEO                          |                 |               | 5.780         | 1.155         |               | 6.935          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>33.190</b>   | <b>55.215</b> | <b>58.391</b> | <b>41.805</b> | <b>25.820</b> | <b>214.421</b> |



# Apertura de Vías

## Reportes Año 2020

| CORREGIMIENTOS       | METROS LINEALES | KILOMETROS |
|----------------------|-----------------|------------|
| BRUSELAS             | 110             | 0,11       |
| CHARGUAYACO          | 70              | 0,07       |
| GUACACALLO           | 4.320           | 4,32       |
| LA LAGUNA            | 1.090           | 1,09       |
| <b>Total general</b> | <b>5.590</b>    | <b>5,6</b> |

## Reportes Año 2021

|                      | Suma de Apertura |
|----------------------|------------------|
| <b>RURAL</b>         | <b>8.020</b>     |
| BRUSELAS             | 6.360            |
| CHARGUAYACO          |                  |
| CHILLURCO            | 300              |
| CRIOLLO              | 960              |
| GUACACALLO           | 400              |
| LA LAGUNA            |                  |
| PALMARITO            |                  |
| REGUEROS             |                  |
| REPARCHEO            |                  |
| <b>URBANO</b>        | <b>700</b>       |
| 1 COMUNA             | 700              |
| 2 COMUNA             |                  |
| 3 COMUNA             |                  |
| 4 COMUNA             |                  |
| REPARCHEO            |                  |
| <b>Total general</b> | <b>8.720</b>     |

Avance Año 2022

Actualmente se tiene un avance de 3050 ml de apertura de vías



# Programación de Maquinaria (Mayo, Junio de 2022)

| MES   | INTERVENCIONES  |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| MAYO  | URBANO<br>GUACACALLO (Paraíso La Palma, Guacacallo)   | URBANO<br>PALMARITO (Los Andes)  | CRIOLLO (Santa Ines, Albania, Castilla, Versalles, Criollo, Cabuyo, Santa Helena, Rincón de Contador, El Maco ... Veredas a Priorizar) | URBANO<br>BRUSELAS (El Encanto, Alto de La Cruz, Cristalina, Palmito, Santa fé - Bombonal, Miraflores, Pencil, La Esperanza... Veredas a Priorizar) |
| JUNIO   | LA LAGUNA (Arrayanes, La Florida, 7 De Agosto, Mirador)<br>REGUEROS (Aguas Negras, La Reserva, Corinto La Parada) | CHILLURCO (Montebonito Puerto Seco, Chillurco, La Paz, La Meseta, Girasol, El Rosal, Vegas de Alumbre.. Veredas a Priorizar) |  |   |
| NOTAS   |   |  |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>° Los Kit's de maquinaria constan de: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora sobre llantas, 1 Volqueta, 1 VibroCompactador.</li> <li>° El Equipo de maquinaria será verificado en sus actividades por la Dirección Técnica de Obras de la Secretaría de Infraestructura.</li> <li>° El desplazamiento de la maquinaria a los sitios programados será autorizado por la Dirección Técnica de Obras.</li> <li>° En casos de emergencias viales y necesidades de uso por parte de la Alcaldía Municipal, el equipo de maquinaria podrá ser retirado.</li> <li>° Se realizará apoyo de equipos y kits de maquinaria en frentes de trabajo con la disponibilidad de alquiler de maquinaria adicional.</li> </ul> |   |  |  |   |



# Aclaración en operatividad maquinaria

- No se han recibido peticiones, quejas o reclamos.
- Contratación Personal de Apoyo para Operatividad Maquinaria (5 operarios).
- Suministro Combustible Constante Anualmente para Operatividad de Maquinaria.
- Suministro de Recebo para el sector Urbano
- Suministro de Recebo de las comunidades rurales por efectividad para mantenimiento.
- Atención vial de maquinaria sin contraprestación
- Es importante tener en cuenta que muchas veces las comunidades aportan maquinaria y/o volquetas complementarias para la realización de MINGAS COMUNITARIAS las cuales benefician a los habitantes de los diferentes sectores que se intervienen, en donde por ejemplo: Muchas veces la administración municipal a través de la secretaria de infraestructura pone a disposición para las actividades que se pretendan realizar: Motoniveladora y Volquetas, y por otra parte la comunidad aporta retroexcavadora y volquetas complementarias para que les rinda y avancen de manera significativa en los mantenimientos viales que se realizan.



# 3 ■ Informe de los recursos del año 2021 en donde se tuvieron recursos sin ejecutar en esa vigencia

Región que vive



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región que vive

# Gestión de Procesos de Contratación Año 2021

Año 2021

Contratación de 14 procesos para construcción de Obras y 5 procesos para Interventoría, gestión para adición de recursos en 3 Obras en ejecución de años anteriores

|  |                         |
|--|-------------------------|
| TERMINACION CONSTRUCCION VELODROMO CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA"  | 96.257.401,00           |
| CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO ACCESO Y PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CARRERA 6 SOBRE EL RÍO GUARAPAS EN EL BARRIO LIBERTADOR MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA"  | 1.910.833.422,00        |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO Y CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA HIGUERON, CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO, MUNICIPIO DE PITALITO HUILA | 5.927.976,95            |
|  | <b>2.013.018.799,95</b> |

| No contrato                             | objeto   |
|---|--|
| CONTRATO DE M.C. No.034-2021            | MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE BIENES DE MUNICIPIO.  |
| CONTRATO DE M.C. No.052-2021            | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE ESTRIBO DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUACHICOS EN VÍA A VEREDA HOLANDA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA                                |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.361 DE 2021 | CONSTRUCCION CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.281 DE 2021 | CONSTRUCCION BOCATOMA, DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELLA VISTA CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA FASE I            |
| CONTRATO DE M.C. No.049-2021            | MEJORAMIENTO, REPARACION Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO.   |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.281 DE 2021 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA   |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.372 DE 2021 | CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE PITALITO  |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.384 DE 2021 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PITALITO BRISAS DEL GUARAPAS COMUNA 1 HUILA  |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.411 DE 2021 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PITALITO BRUSELAS HUILA  |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 537 DE 2021 | CONSTRUCCION Y O REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO  |
| CONTRATO DE M.C. 059-2021               | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EXTERNA DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA   |
| CONTRATO DE M.C. No.056-2021            | REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON ESTRUCTURA EN ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.  |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 532-2021   | EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RECUPERACION, ORNATO Y EMBELLECCIMIENTO DE GLORIETA SAN ANTONIO UBICADA EN LA INTERSECCION ENTRE LA CALLE 10 Y LA AVENIDA LOS GUADUALES, DEL MUNICIPIO DE PITALITO |
| CONTRATO DE M.C. 057-2021               | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO LA CHAPOLERA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  |



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región de Vive

# Gestión de Procesos de Contratación Año 2021

Seis (6) Procesos de Contratación fueron radicados en la Oficina de Contratación en el año 2021, con resultados por cronograma de contratación sin adjudicarse antes del 31 de Diciembre de 2021, por lo tanto pasaron recursos a Superávit para año 2022



|   |                       |     |
|---|-----------------------|-----|
| Adiciones Contratación 2021                                     | 2.013.018.800         |     |
| Total Contratación 2021   | 22.952.780.374        |     |
| <b>Total Gestión 2021</b>                                       | <b>24.965.799.174</b> | 85% |
| En Proceso de Contratación 2021                                 | 4.577.438.726         | 15% |
| <b>Total Recursos Gestionados para Procesos de Contratación</b> | <b>29.543.237.900</b> |     |



| NOMBRE PROCESO  |             | MODO CONTRATACIÓN | VALOR            | ESTADO A DICIEMBRE 2021  | ESTADO A MAYO 23 DE 2021          | OBSERVACIONES  |
|---|-------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------------|--|
| PAVIMENTACIÓN BRUSELAS DPS - CONVENIO 343 FIP DE 2021 | PLIEGO TIPO | LICITACIÓN        | 1.152.571.725,38 | SUSCRITO EN MAYO DE 2021<br>ETAPA DE MADURACIÓN TERMINADA EN OCTUBRE DE 2021<br>RADICADO OCTUBRE 2021<br>OFICINA DE CONTRATACIÓN MODIFICADO NOVIEMBRE DE 2021<br>SIN ADJUDICACIÓN 2021   | CONTRATADO - CONTRATO 284 DE 2022 | PROCESO REINICIADO MARZO 2022<br>SE PRESENTARON 13 PROPONENTES |
| OBRAS PALMARITO INVIAS - CONVENIO 1892 DE 2020        | PLIEGO TIPO | LICITACIÓN        | 580.000.000,00   | SUSCRITO EN DICIEMBRE DE 2020<br>VISITA DE OBRA INVIAS MAYO DE 2021<br>ESTUDIOS TÉCNICOS APROBADOS EN AGOSTO DE 2021<br>RADICACIÓN PROCESO EN SEPTIEMBRE DE 2021<br>EN OFICINA DE CONTRATACIÓN MODIFICADO NOVIEMBRE DE 2021<br>SIN ADJUDICACIÓN 2022 | CONTRATADO - CONTRATO 285 DE 2023 | PROCESO REINICIADO MARZO 2022<br>SE PRESENTARON 4 PROPONENTES  |
| OBRAS CRIHU INVIAS - CONVENIO 1348 DE 2021            | PLIEGO TIPO | LICITACIÓN        | 467.164.000,00   | SUSCRITO EN AGOSTO DE 2021<br>ESTUDIOS TÉCNICOS APROBADOS EN OCTUBRE DE 2021<br>RADICACIÓN PROCESO EN OCTUBRE DE 2021<br>EN OFICINA DE CONTRATACIÓN MODIFICADO NOVIEMBRE DE 2021<br>SIN ADJUDICACIÓN 2022  | CONTRATADO - CONTRATO 286 DE 2024 | PROCESO REINICIADO MARZO 2022<br>SE PRESENTARON 4 PROPONENTES  |



|  |             |  |                         |   |  |  |
|--|-------------|--|-------------------------|---|--|--|
| REPARCHEO OBRA                                     | PLIEGO TIPO | LICITACIÓN                                   | 624.000.000,00          | SEPTIEMBRE DE 2021 - CAMBIO DE DESTINO EMPRÉSTITO CONCEJO MUNICIPAL RADICADO PROCESO EN OCTUBRE DE 2021   | PROCESO DE CONTRATACIÓN - PROponentes (40)                                     | PROCESO REINICIADO MARZO 2022 SE PRESENTARON 40 PROponentes                      |
| REPARCHEO INTERVENTORÍA                            | PLIEGO TIPO | CONCURSO DE MÉRITOS                          | 43.698.000,00           | MODIFICADO NOVIEMBRE DE 2021 SIN ADJUDICACIÓN 2021  | PROCESO DE CONTRATACIÓN - PROponentes (4)                                      | PROCESO REINICIADO MARZO 2022 SE PRESENTARON 4 PROponentes                       |
| MAQUINARIA (MOTONIVELADOR A/RETROCARGADOR)         |             | SUBASTA INVERSA                              | 1.500.000.000,00        | Comisionista de Bolsa Mercantil Ejecución del Proceso Contractual en Bolsa Mercantil PROCESO QUE TUVO DOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y NO SE PRESENTARON OFERENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE | RADICADO PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCION ABREVIADA MODALIDAD SUBASTA INVERSA | Para Compra de Motoniveladora y Retrocargador                                    |
| ESTUDIOS PSMV, PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS BRUSELAS | PLIEGO TIPO | CONCURSO DE MÉRITOS                          | 210.000.000,00          | EN 2021 SE TRABAJÓ EN ESTUDIOS PREVIOS  | ESTUDIOS PREVIOS CONSULTORÍA (RADICACIÓN MAYO DE 2021)                         |  |
| OBRAS TERMINACIÓN VELODROMO                        |             | LICITACIÓN - CONSULTORÍA CONCURSO DE MÉRITOS | 584.000.000,00          | EN 2021 NO SE HABÍA AUTORIZADO LA EJECUCIÓN DE ÉSTOS RECURSOS   | ESTUDIOS PREVIOS CONSULTORÍA (RADICACIÓN JUNIO DE 2021)                        | MEJORAMIENTO EXTERIORES VILLA OLÍMPICA, CANCHA SINTETICA, VELODROMO, PATINODROMO |
| OBRAS ESPACIO PÚBLICO                              |             | LICITACIÓN                                   | 415.000.000,00          | EN 2021 NO SE HABÍA AUTORIZADO LA EJECUCIÓN DE ÉSTOS RECURSOS   | ESTUDIOS PREVIOS OBRAS PLAN PARQUES (RADICACIÓN JUNIO DE 2021)                 | PLAN PARQUES   |
| ANDENES PITALITO                                   |             | LICITACIÓN                                   | 300.000.000,00          | EN 2021 SE TRABAJÓ EN ESTUDIOS PREVIOS  |  |  |
|  |             |  | <b>5.876.433.725,38</b> |   |  |  |
|  |             | <b>78%</b>                                   | <b>4.577.433.725,38</b> | <b>RADICADO, EN PROCESO Y/O ADJUDICADO</b>  |  |  |



# Aclaración en gestión y eficiencia contratación

- Que aproximadamente del 74% de los recursos autorizados para realizar la contratación, se habían radicado todos los procesos en la Oficina de Contratación en el año 2021, y no lograron ser adjudicados.
- Que la Secretaría de Infraestructura realiza el proceso precontractual de estudios previos para que la Oficina de contratación lleve adelante el proceso de contratación y adjudicación.
- Que debido a que los convenios en su estructuración por entidades nacionales requirieron ajustes en los últimos meses del año 2021, éstos afectaron los tiempos de contratación.
- Que debido a que Colombia Compra Eficiente, requirió cambios y/o modificaciones al pliego tipo (DOCUMENTOS TIPO PARA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 03 – CON LAS MODIFICACIONES DE LA RESOLUCIÓN 304 DE 2021 – VERSIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 02/11/2021) en medio del proceso de contratación, éstos requirieron ser modificados y así mismo se perdió tiempo de cronograma de contratación, que afectaron con la No Adjudicación a Diciembre 31 de 2021.
- Que a fecha de mayo de 2022, se tienen aproximadamente el 78% de recursos en adjudicación, contratados y/o en proceso de contratación.
- Que a Junio de 2022 se está planeando realizar la adjudicación del resto del 22% de los recursos aquí relacionados.



# **4. Informe de los proyectos de inversión de ejecución del empréstito aprobado por el Concejo Municipal para el fortalecimiento de la infraestructura vial urbana y rural del Municipio de Pitalito mediante Acuerdo 006 de 2021**



# Empréstito aprobado mediante Acuerdo 006 de Marzo de 2021

## EMPRESTITO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

| ITEM | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR                | PORCENTAJE  |
|------|--|--------|----------|----------------------|-------------|
| 1.0  | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO          | GL     | 1        | 1.500.000.000        | 21%         |
| 2.0  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL RURAL MEDIANTE PLACA HUELLAS EN LA ZONA RURAL                       | GL     | 1        | 1.000.000.000        | 14%         |
| 3.0  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL URBANA MEDIANTE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA URBANA | GL     | 1        | 4.500.000.000        | 64%         |
|      | <b>TOTAL</b>   |        |          | <b>7.000.000.000</b> | <b>100%</b> |



# 1. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO

La adquisición de maquinaria pesada para la atención de obras urbanas y rurales del municipio de Pitalito tiene un valor total de **MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000,00)**.

- Comisionista de Bolsa Mercantil  
Para la ejecución del proyecto se derivó el proceso **MP-SI-RE-CB-715-2021** que tiene por objeto **LA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA-SCB CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS -MCP- DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. -BMC-, LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN RETRO CARGADOR SOBRERUEDAS Y UNA MOTONIVELADORA PARA EL MUNICIPIO DE PITALITO**".
- Ejecución del Proceso Contractual en Bolsa Mercantil  
Del Proceso efectuado en la Bolsa Mercantil se realizó dos veces la subasta con el fin de realizar la adquisición de la maquinaria proceso que no se pudo realizar teniendo en cuenta que se realizaron diferentes observaciones al proceso solicitando cambios sustanciales al proceso y sus consideraciones técnicas y no se presentaron proponentes al proceso.
- Situación Actual de Proceso  
Es preciso informar que al no haber podido adjudicar el proceso en el año 2021, los recursos presupuestados en la vigencia, requirieron de pasar por el procedimiento de aprobación de superávit presupuestal para realizar adición en el año 2022 y realizar otra vez la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Año 2022.



# 1. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO

La Maquinaria que se tiene prevista para poder comprar es un kit de maquinaria que comprende de los siguientes equipos:

- Motoniveladora
- Retrocargador sobre llantas
- Volqueta

Es preciso y necesario informar al Concejo Municipal que los recursos aplicados para el comisionista de Bolsa no fueron pagados ni ejecutados al no tener éxito en la adjudicación del proceso, por lo tanto, no se ha realizado ninguna pérdida de recursos por la realización del proceso.

***La Secretaría de Infraestructura ha realizado la radicación del Proceso de Contratación a la Oficina de Contratación del Municipio para avance y adjudicación del Proceso por la modalidad de Subasta por no haber tenido éxito con la Bolsa Mercantil***



## 2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL

- Se realizó el convenio interadministrativo CN2021-1161 que tiene por **objeto AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria del Municipio de Pitalito- Huila, mediante la construcción de placas huella en veredas de interés cafetero así: Corregimiento Charguayaco (Veredas: Higueron- Sector Ventilador, El Triunfo, Paraíso); Corregimiento Palmarito (Vereda San Martín); Corregimiento La Laguna (Vereda Siete (7) de Agosto); Corregimiento Criollo (Veredas: El Jardín- Filo Seco y El Recuerdo) Corregimiento Bruselas (Veredas La Esmeralda, Kenedy- Sector La Batea y El Diamante) Corregimiento Guacacallo (Vereda Buenos Aires); Corregimiento Chillurco (Vereda Girasol, Altos del Magdalena y Alto Pinos) Corregimiento Regueros (Vereda San Luis).**
- El Convenio interadministrativo fue celebrado por un valor de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.549.952.153)** de los cuales el Municipio de Pitalito realizó un aporte por valor de **MIL MILLONES DE PESOS (\$ 1.000.000.000,00)** el cual beneficia a la comunidad de la zona rural del Municipio Pitalito.

## 2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL RURAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL



Terminación, con actividades de revisión, entrega, caracterización y georreferenciación para la liquidación del convenio interadministrativo

| No. | Vereda                          | Corregimiento | Longitud (ML) |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1   | Higuerón (Sector el Ventilador) | Charguayaco   | 100           |
| 2   | El Triunfo                      | Charguayaco   | 100           |
| 3   | Paraíso Charguayaco             | Charguayaco   | 100           |
| 4   | San Martin                      | Palmarito     | 200           |
| 5   | 7 De Agosto                     | La Laguna     | 100           |
| 6   | El Jardín (Sector Filo Seco)    | Criollo       | 100           |
| 7   | El Recuerdo                     | Criollo       | 100           |
| 8   | La Esmeralda                    | Bruselas      | 100           |
| 9   | Kennedy (Sector La Batea)       | Bruselas      | 100           |
| 10  | Buenos Aires                    | Guacacallo    | 100           |
| 11  | El Diamante                     | Bruselas      | 100           |
| 12  | El Girasol (vía Miravalles)     | Chillurco     | 100           |
| 13  | Altos Del Magdalena             | Chillurco     | 150           |
| 14  | Alto Pinos                      | Chillurco     | 100           |
| 15  | San Luis                        | Regueros      | 100           |
|     |                                 |               | <b>1650</b>   |



## 2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR URBANO

Estructuración de los estudios previos y diseños de vías para tener en el alcance de ejecución del proyecto que objeto CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL URBANA MEDIANTE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO EN VÍAS DE INTERCONEXIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE PITALITO.

Esos procesos tendrán un valor de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 4.500.000.000,00) con el cual se beneficiaran a familias de las cuatro comuna del Municipio de Pitalito, en vías que se vienen trabajando con las comunidades y necesidades de mejoramiento vial urbano para solucionar movilidad urbana e interconexión.

Estos recursos actualmente se están tramitando para la incorporación en el presupuesto del año 2022, para la gestión de su uso en contratación, así como se está avanzando en la estructuración del proyecto de inversión.




## 2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR URBANO

Fase I (Regalías):  
74 Cuadras

Fase II (Recursos Propios):  
45-50 cuadras

Fase III (Regalías):  
30 Cuadras

50% Meta PDM

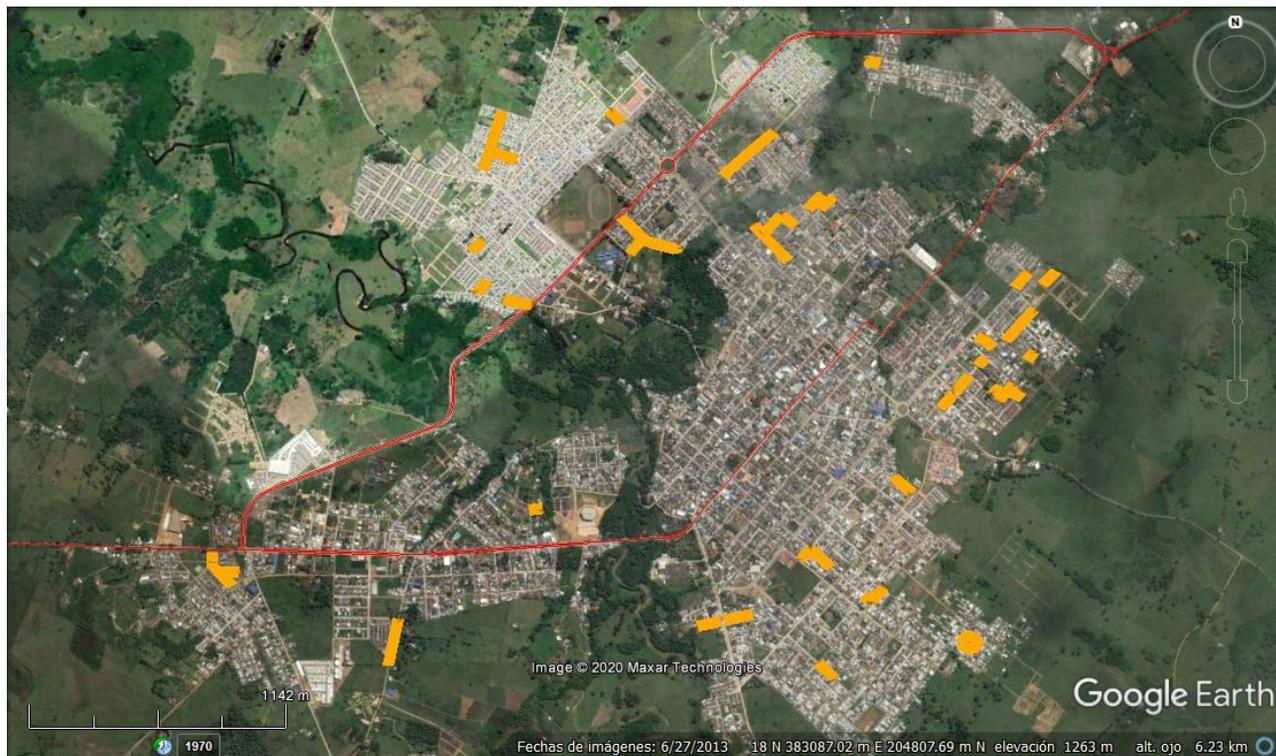

Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región Vive

# 5 ■ Informe a cuanto asciende los recursos adjudicados a la Secretaría de Infraestructura para la vigencia 2022 y su Plan de Acción



# METAS DEL PLAN DE DESARROLLO PITALITO, REGIÓN QUE VIVE 2020-2023

## PRESUPUESTO AÑO 2022

| Nombre                               | AUX           |
|--------------------------------------|---------------|
| Secretaría de Vías e Infraestructura | 254           |
| Apropiado                            | 1.632.303.388 |
| Adicion                              | 6.537.498.293 |
| Credito                              | 1.096.900.000 |
| ContraCredito                        | 1.396.953.000 |
| TotalApropiado                       | 7.869.748.681 |
| Disponibilidad                       | 5.876.829.319 |
| SaldoDisponible                      | 1.992.919.362 |

## PRESUPUESTO AÑO 2022

| Nombre          | AUX         |
|-----------------|-------------|
| Vivienda        | 260         |
| Apropiado       | 438.471.335 |
| Adicion         | 143.340.577 |
| Credito         | 10.000.000  |
| ContraCredito   | 10.000.000  |
| TotalApropiado  | 581.811.912 |
| Disponibilidad  | 96.084.000  |
| SaldoDisponible | 485.727.912 |



# METAS DEL PLAN DE DESARROLLO PITALITO, REGIÓN QUE VIVE 2020-2023

| Sector                | Programa   | Sub-Programa  | Responsable   | Metas Plan de Desarrollo Municipal 2021 | Metas Plan de Desarrollo Municipal 2022 | Metas Programadas Plan de Acción 2022 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------------|
| TRANSPORTE            | Vías para una Ciudad Región  | Vías Urbanas para una ciudad que vive                             | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Dirección Técnica de Obras Públicas) | 12                                      | 17                                      | 15                                    |
|                       |  | Vías rurales para un municipio que vive                           |   |   |   |                                       |
| VIVIENDA Y DESARROLLO | Mas Familias con Viviendas Dignas para una ciudad sostenible       | Familias con derecho a viviendas dignas para una ciudad acogedora | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Dirección Técnica de Vivienda)       | 6                                       | 5                                       | 4                                     |
|                       | Servicios Públicos: Componente Vital para un territorio productivo | Acueducto sostenible y de calidad para los Laboyanos              | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                       | 4                                       | 6                                       | 6                                     |
|                       |  | Servicios complementarios para un mejor vivir                     | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                       | 8                                       | 7                                       | 6                                     |
|                       | Pitalito Territorio Ordenado y Acogedor                            | Pitalito territorio ordenado y acogedor                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                       | 8                                       | 8                                       | 8                                     |
|                       |  |   |   | <b>38</b>                               | <b>43</b>                               | <b>39</b>                             |



# SECTOR TRANSPORTE

| N°. DE LA META DE PRODUCTO | META DE PRODUCTO  | INDICADOR META DE PRODUCTO  |                                     |                                     |                                    |
|----------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                            |   | NOMBRE  | LINEA BASE VIGENCIA ANTERIOR (2020) | VALOR LOGRADO EN LA VIGENCIA (2021) | VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA 2022 |
| 24                         | Pavimentación vías urbanas  | Vía urbana pavimentada  | 0,00                                | 5,60                                | 10,00                              |
| 300                        | Mantenimiento vías urbanas  | Vía urbana con mantenimiento  | 90,00                               | 80,00                               | 75,00                              |
| 15                         | Apertura de vía urbana y rural  | Vía urbana construida en afirmado   | 4,80                                | 8,70                                | 1,47                               |
| 2                          | Impulsar mejoramiento vial a través de construcción de Puentes Urbanos  | Puente construido en vía urbana   | 0,00                                | 1,00                                | 1,00                               |
| 1                          | Construcción de intercambiador vial   | Intercambiador construido en vía urbana                                   | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
| 5000                       | Terminación de los andenes sobre la avenida Pastrana y otras vías   | Andén de la red urbana en funcionamiento                                  | 0,00                                | 0,00                                | 2000,00                            |
| 1000                       | Impulsar tramos viales como ciclo rutas   | Ciclo infraestructura de la red vial terciaria construida                 | 0,00                                | 0,00                                | 500,00                             |
| 100                        | Habilitación de andenes para población discapacitada  | Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial | 0,00                                | 0,00                                | 100,00                             |
| 500                        | Inventario vial   | Vías terciarias inventariadas   | 0,00                                | 519,40                              | 0,00                               |
| 1                          | Implementar Sistema de Información Geográfica para Georreferenciación de vías del Municipio de Pitalito                       | Sistema de Información Geográfico implementado                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               |
| 4000                       | Rehabilitación de vías pavimentadas existentes  | Rehabilitación, Reconstrucción y Re parcheo de Vías Existentes            | 0,00                                | 0,00                                | 4000,00                            |
| 1                          | Impulsar ampliación del puente avenida Pastrana sobre río Guarapas  | Estudio Realizado   | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
| 3                          | Adquisición de Equipos de Maquinaria Amarilla y vehículos para la atención de vías y fortalecimiento de Equipos de Maquinaria | Maquinaria y/o vehículos Adquiridos                                       | 0,00                                | 0,00                                | 3,00                               |
| 1                          | Elaborar el Plan Vial Municipal Rural   | Estudio Realizado   | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
| 1200                       | Mantenimiento vías rurales  | Vía terciaria con mantenimiento rutinario                                 | 380,00                              | 410,00                              | 300,00                             |
| 3                          | Construcción de Puentes en vías terciarias  | Puente construido en vía terciaria existente                              | 0,00                                | 0,00                                | 3,00                               |
| 12000                      | Placa huella  | Placa huella construida   | 3,74                                | 1,65                                | 4,00                               |



# SECTOR TRANSPORTE

## PAVIMENTOS SECTOR URBANO

Meta Inicial:  
300 CUADRAS



| No           | PROYECTO   | No CUADRAS |
|--------------|--|------------|
| 1            | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA   | 74         |
| 2            | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍAS DEL CENTRO POBLADO DE BRUSELAS, CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA                       | 9          |
| 3            | PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS COMUNITARIOS - EMPRESTITO FASE II   | 45         |
| 4            | PROYECTO PAVIMENTACIÓN URBANA FASE III (REGALIAS)  | 30         |
| 5            | PAVIMENTACIÓN ACCESO PUENTE LIBERTADOR   | 3          |
| 6            | PROYECTO PAVIMENTACION URBANA GOBERNACION - ALCALDÍA (2020)  | 27         |
| 7            | PROYECTO PAVIMENTACIÓN CUADRAS DE BARRIOS COMUNA 1 (2021)  | 26         |
| 8            | PROYECTO PAVIMENTACIÓN GOBERNACIÓN 2022  | 18         |
| 9            | PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRERA 21 ENTRE LA TRANSVERSAL 20 Y LA CALLE 10 DEL BARRIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 6          |
| 10           | PROYECTO PAVIMENTACIÓN VÍA PALESTINA   | 30         |
| 11           | PROYECTO PAVIMENTACIÓN GOBERNACIÓN EN ESTRUCTURACIÓN (ANILLO VIAL INTERNO/VÍA PAISAJÍSTICA)  |            |
| 12           | PROYECTO PAVIMENTACIÓN ANILLO VIAL EXTERNO CARRERA 9 ESTE  |            |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>268</b> |



# SECTOR TRANSPORTE

## PLACA HUELLAS SECTOR RURAL

Meta Inicial:  
5000 ml

Meta cumplida en año 2021

Meta Reprogramada:  
12000 ml

### PLACA HUELLAS FINANCIACIÓN (A 23 DE MAYO DE 2021)

| PROYECTOS  | Estado              | Longitud (ml) | No de Tramos |
|--|---------------------|---------------|--------------|
| Comité de Cafeteros 2020                               | Construidas 2021    | 1464          | 14           |
| Ocad PAZ - Regalías 2019-2020                          | Construidas 2022    | 2340          | 9            |
| Comité de Cafeteros 2021                               | Construidas 2022    | 1650          | 15           |
| Invias Colombia Rural - Palmarito                      | Ejecución 2023      | 257           | 2            |
| Invias Colombia Rural - Territorios Indigenas          | Ejecución 2023      | 256           | 3            |
| Unidad de Víctimas - 13 Veredas                        | Aprobación Proyecto | 1300          | 13           |
| Proyecto Gobernación del Huila - Municipio de Pitalito | Aprobación Proyecto | 2217          | 15           |
| <b>TOTAL</b>   |                     | <b>9484</b>   | <b>71</b>    |



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región de Vive

# SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

| N° | LINEA ESTRATEGICO   | SECTOR FUT                        | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | INDICADOR DE BIENESTAR                  | N°. DE LA META DE PRODUCTO | META DE PRODUCTO                              | INDICADOR META DE PRODUCTO                                |                              |                               |                              |
|----|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|    |   |                                   |                                  |   |                            |   | NOMBRE  | LINEA BASE VIGENCIA ANTERIOR | VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA | VALOR LOGRADO EN LA VIGENCIA |
| 1  | PITALITO VIVE Y PRODUCE EN UN TERRITORIO QUE CONOCE Y RESPETA | VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | Acceso a soluciones de vivienda  | DEFICIT DE VIVIENDA CUALITATIVO         | 700                        | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL               | Hogares beneficiados con Mejoramiento de Vivienda Rurales | 110                          | 200                           |                              |
| 2  |   |                                   | Acceso a soluciones de vivienda  | INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL(imp) | 100                        | LEGALIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS Y RURALES | Asistencias Tecnicas y Juridicas Realizadas               | 41                           | 30                            |                              |
| 3  |   |                                   | Acceso a soluciones de vivienda  | DEFICIT DE VIVIENDA CUANTITATIVO        | 500                        | CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA URBANA         | Viviendas de Interes Prioritario Urbanas Construidas      | 100                          | 190                           |                              |
| 4  |   |                                   | Acceso a soluciones de vivienda  | DEFICIT DE VIVIENDA CUALITATIVO         | 300                        | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA              | Hogares beneficiados con Mejoramiento de Vivienda Urbana  | 112                          | 75                            |                              |



# SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

| PRODUCTO                              | META CUATRENIO (INICIAL) | MODIFICACIÓN (2021) | META CUATRENIO (FINAL) |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL       | 400                      | +300                | <b>700</b>             |
| LEGALIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS   | 100                      | -                   | <b>100</b>             |
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA | 300                      | +200                | <b>500</b>             |
| MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA      | 300                      | -                   | <b>300</b>             |
| MEJORAMIENTO SOSTENIBLE DE BARRIOS    | 2                        | -                   | <b>2</b>               |

**Año 2022**  
**Mejoramientos Urbanos**  
**Mejoramientos Rurales**

| PROYECTO                             | ENTIDAD APORTE                                | No Mejoramientos |
|--------------------------------------|---|------------------|
| Mejoramientos Rurales 2021           | Municipio de Pitalito                         | 110              |
| FEST DPS                             | Municipio de Pitalito - DPS                   | 25               |
| Mejoramientos Tipo Módulo Rural      | Municipio de Pitalito - Gobernación del Huila | 262              |
| Mejoramientos Tipo Locativo Rural    | Municipio de Pitalito - Gobernación del Huila | 107              |
| Mejoram. Madres Comunitarias Rurales | Gobernación del Huila                         | 55               |
|                                      |   | <b>559</b>       |

| PROYECTO                             | ENTIDAD APORTE        | No Mejoramientos |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Mejoramientos Urbanos 2021           | Municipio de Pitalito | 112              |
| Mejoram. Madres Comunitarias Urbanos | Gobernación del Huila | 75               |
|                                      |                       | <b>187</b>       |



# SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

| N° DE LA META DE RESULTADO | META DE PRODUCTO  | INDICADOR META DE PRODUCTO  |                                     |                                     |                                    |
|----------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                            |   | NOMBRE  | LINEA BASE VIGENCIA ANTERIOR (2020) | VALOR LOGRADO EN LA VIGENCIA (2021) | VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA 2022 |
| 4                          | Apoyo a Sistemas de Acueductos Veredales  | Acueductos veredales diseñados y/o construidos  | 0,00                                | 1,00                                | 2,00                               |
| 20                         | Acueductos optimizados  | Sistemas de acueductos adecuados, ampliados y/o optimizados                                     | 0,00                                | 5,00                                | 10,00                              |
| 1                          | Sistema Información Acueductos Rurales  | Inventario y Diagnóstico actualizado de sistemas de acueductos rurales                          | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
| 300                        | Sistemas de descontaminación de aguas servidas en área rural                                | Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias                               | 0,00                                | 0,00                                | 150,00                             |
| 4                          | Apoyo a Sistemas de Alcantarillado sanitario rurales  | Diseño, Construcción, ampliación y/o adecuación de sistemas de alcantarillados rurales          | 0,00                                | 0,00                                | 2,00                               |
| 1                          | Fortalecer y fomentar programas de separación en la fuente, como una responsabilidad social | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Implementado                                       | 0,00                                | 1,00                                | 1,00                               |
| 200                        | Ampliación del servicio de energía eléctrica área rural.                                    | Viviendas beneficiadas con la construcción de redes eléctricas rurales.                         | 0,00                                | 0,00                                | 100,00                             |
| 4                          | mantenimiento correctivo de alumbrado público anual   | Luminarias para mantener anualmente del sistema de Alumbrado Público en el casco urbano y rural | 1,00                                | 1,00                                | 1,00                               |
| 2                          | ampliación de alumbrado público   | Ampliación de cobertura del servicio casco urbano y rural                                       | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
| 4                          | inventario de luminarias, estructuras y redes del alumbrado público                         | Número de Inventarios del sistema de alumbrado público realizados                               | 1,00                                | 1,00                                | 1,00                               |
| 2                          | Modernización del sistema de alumbrado público  | equipos lumínicos del municipio en el casco urbano y rural                                      | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
| 4                          | Implementación de alumbrado navideño  | Entorno apto en las festividades de navidad, fin de año y día de reyes                          | 0,00                                | 1,00                                | 1,00                               |
| 7                          | Ampliación de cobertura de gas domiciliario   | Gasoducto ramal construido  | 0,00                                | 12,00                               | 0,00                               |



# SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

| CONVENIO REDES GASIFICACIÓN RURAL  |                         |               |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| CONVENIENTES                       | APORTES                 | %             |
| Departamento                       | \$ 2.301.436.759        | 28,92         |
| SURGAS                             | \$ 4.438.355.106        | 55,77         |
| Mpios                              | \$ 1.219.180.469        | 15,32         |
| <b>Valor TOTAL Convenio</b>        | <b>\$ 7.958.972.334</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Inversión TOTAL EN PITALITO</b> | <b>\$ 3.796.617.772</b> | <b>100,00</b> |
| Inversión Goberación               | \$ 544.446.288          | 14,34         |
| Inversión Pitalito                 | \$ 362.964.192          | 9,56          |
| Inversión SURGAS                   | \$ 2.889.207.292        | 76,10         |
| Total beneficiarios en el Dpto     | 20.796                  |               |
| Total Beneficiarios Pitalito       | 1.340                   |               |

| VEREDAS   | VALOR                   | %             |
|---|-------------------------|---------------|
| Barrio Palmitas   | \$ 761.693.077          | 20,06         |
| Santfé, Bombonal, Primavera y El Carmen -Bruselas                         | \$ 827.193.874          | 21,79         |
| Puerto Lleras   | \$ 86.440.811           | 2,28          |
| Charguyaco, Paraiso de Charguyaco, Laureles, Honda-Porvenir, Barranquilla | \$ 1.639.317.237        | 43,18         |
| Tigre   | \$ 328.382.105          | 8,65          |
| Raicita   | \$ 153.590.668          | 4,05          |
| <b>TOTAL INVERSION PITALITO</b>   | <b>\$ 3.796.617.772</b> | <b>100,00</b> |

LA LAGUNA, LA FLORIDA, EL BOMBO, MIRADOR, LA UNION, SIETE DE AGOSTO, LAGUNA VERDE Y REMOLINO

EL GUAMAL, LA RESERVA

PALMARITO, SANTA ROSA Y SAN MARTIN

VERSALLES, CABUYO, JARDIN, PALMAR

CRIOLLO, INGALI



# SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

| Alcaldía Municipal-Pitalito Huila | N° | LINEA ESTRATEGICO   | SECTOR FUT (sector dnp)           | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (programa P) | N° DE LA META DE RESULTADO | META DE PRODUCTO  | INDICADOR META DE PRODUCTO |                                     |                                     |                                    |
|-----------------------------------|----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |    |   |                                   |   |                            |   | NOMBRE                     | LINEA BASE VIGENCIA ANTERIOR (2020) | VALOR LOGRADO EN LA VIGENCIA (2021) | VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA 2022 |
|                                   | 31 | PITALITO VIVE Y PRODUCE EN UN TERRITORIO QUE CONOCE Y RESPETA | VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano  | 40                         | Programa "Parques del Macizo", para cambiar las zonas verdes por "Mi parque"  | Zonas verdes adecuadas     | 0,00                                | 5,00                                | 25,00                              |
|                                   | 32 | PITALITO VIVE Y PRODUCE EN UN TERRITORIO QUE CONOCE Y RESPETA | VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano  | 4                          | Adecuar sitios de espacio público de sitios asociados con inseguridad, que sean embellecidos y mejorados. Al menos uno por año.   | Zonas verdes mantenidas    | 0,00                                | 1,00                                | 1,00                               |
|                                   | 33 | PITALITO VIVE Y PRODUCE EN UN TERRITORIO QUE CONOCE Y RESPETA | VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano  | 1                          | Proyecto para la construcción de un cementerio público  | Estudios realizados        | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
|                                   | 34 | PITALITO VIVE Y PRODUCE EN UN TERRITORIO QUE CONOCE Y RESPETA | VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano  | 1                          | Estudios para la construcción del Parque longitudinal de la Quebrada Cálamo   | Estudios realizados        | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
|                                   | 35 | PITALITO VIVE Y PRODUCE EN UN TERRITORIO QUE CONOCE Y RESPETA | VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano  | 1                          | Estudios para la peatonalización del microcentro de Pitalito  | Estudios realizados        | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
|                                   | 36 | PITALITO VIVE Y PRODUCE EN UN TERRITORIO QUE CONOCE Y RESPETA | VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano  | 1                          | Construcción del parque Gran Plaza Pitalito y "Centro Empresarial y financiero Surcolombiano" incluyendo al mismo el componente de traslado de las asociaciones ACOPAP y ACOSUR | Estudios realizados        | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
|                                   | 37 | PITALITO VIVE Y PRODUCE EN UN TERRITORIO QUE CONOCE Y RESPETA | VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano  | 1                          | Remodelación y reconversión comercial de la plaza de mercado minorista de Pitalito.   | Estudios realizados        | 0,00                                | 0,00                                | 1,00                               |
|                                   | 38 | PITALITO VIVE Y PRODUCE EN UN TERRITORIO QUE CONOCE Y RESPETA | VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano  | 1                          | Construir un centro Saúdete al parque   | Espacio público construido | 0,00                                | 2,00                                | 2,00                               |




**6 ■ Informe de ejecución Detallado de las obras de infraestructura que se ha culminado o está en proceso de culminación en esta administración, y las que presentan atraso o interrupción definitiva, detallando los motivos para tal decisión, tal como es el caso del Colector de Aguas Lluvias de la Comuna Uno y Dos, entre otros.**



# ¡ PITALITO EN OBRAS !

## INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRAS

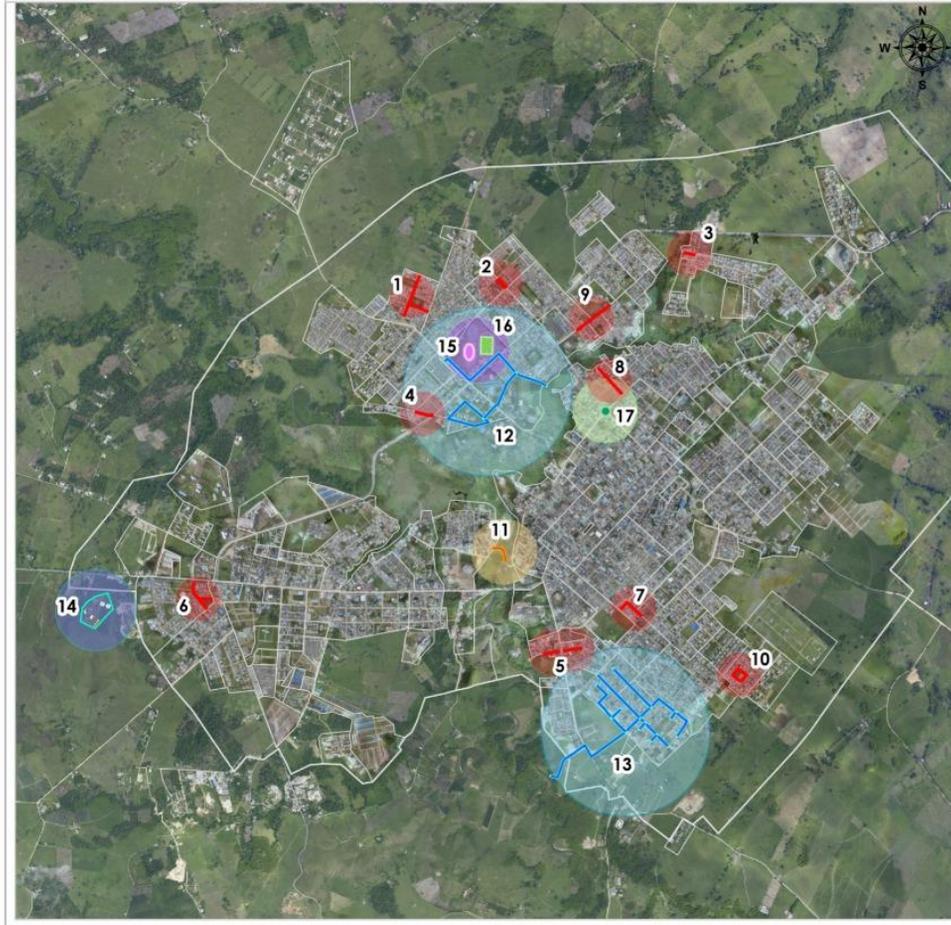

Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila

Región que Vive

### DATOS GENERALES DE LAS OBRAS

| No. | BARRIO / SECTOR            | OBRA                      |
|-----|----------------------------|---------------------------|
| 1   | Las Américas               | Pavimentación - 8 cuadras |
| 2   | Divino Niño                | Pavimentación - 2 cuadras |
| 3   | Lara Bonilla               | Pavimentación - 1 cuadra  |
| 4   | Brisas del Guarapas        | Pavimentación - 3 cuadras |
| 5   | León XIII                  | Pavimentación - 2 cuadras |
| 6   | Madelena                   | Pavimentación - 4 cuadras |
| 7   | Las Villas                 | Pavimentación - 4 cuadras |
| 8   | San Antonio                | Pavimentación - 3 cuadras |
| 9   | Porvenir - Villa del Prado | Pavimentación - 5 cuadras |
| 10  | La Gaitana                 | Pavimentación - 4 cuadras |
| 11  | Libertador                 | Puente Libertador         |
| 12  | Cálamo                     | Colector Comuna 1         |
| 13  | La Pradera                 | Colector Comuna 2         |
| 14  | Lomitas                    | PTAP - Acueducto Fase 1   |
| 15  | Cálamo                     | Velódromo                 |
| 16  | Cálamo                     | Cancha Sintética          |
| 17  | San Antonio                | Glorieta San Antonio      |

### CONVENCIONES

|  |                          |  |                      |  |                     |
|--|--------------------------|--|----------------------|--|---------------------|
|  | Colectores Aguas Lluvias |  | Glorieta San Antonio |  | PTAP                |
|  | Puente Barrio Libertador |  | Cancha Sintética     |  | Barrios/Sectores    |
|  | Tramos Pavimentación     |  | Velódromo            |  | Perímetro Suburbano |

ESCALA

1:30.000

SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL

Coordinate System: UTM 12  
 Projection: Transverse Mercator  
 Datum: MACGNA  
 False Easting: 5.000.000.000  
 False Northing: 2.000.000.000.000  
 Central Meridian: -75.0000  
 Scale Factor: 0,9992  
 Latitude Of Origin: 4.0000  
 Units: Meter



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



alcaldiapitalito.gov.co

Región que Vive

# CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA

|                         |   |                             |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| CONTRATO OBRA:          | PAF-ATF-O-045-2019  | EJECUCIÓN<br><br><b>25%</b> |
| CONTRATISTA:            | UNION TEMPORAL G.A.D<br>PITALITO  |                             |
| CONTRATO INTERVENTORÍA: | PAF-ATF-O-039-2019  |                             |
| INTERVENTOR:            | CONSORCIO INTER<br>HUILA 2019   |                             |
| OBJETO:                 | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II<br>DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA   |                             |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN: | Presupuesto General de la Nación - PDA - Plan<br>Departamental de Aguas   |                             |
| CONVENIO:               | Convenio interadministrativo de Cooperación Técnica y<br>Apoyo Financiero celebrado entre el Ministerio de Vivienda,<br>Ciudad y Territorio, la financiera del desarrollo territorial S.A<br>FINDETER, Aguas del Huila S.A E.S.P. y El Municipio de<br>Pitalito - Departamento del Huila, No. 297 de 2017 |                             |
| PLAZO INICIAL:          | VEINTE (20) MESES   |                             |
| VALOR INICIAL:          | 15.356.858.116  |                             |
| BENEFICIADOS:           | Totalidad de la Población Urbana del Municipio de Pitalito<br>que se incrementa la población beneficiada de 104.878 a<br>210.283 habitantes.  |                             |
| Reformulación<br>No 1   | No. 2018EE0070627 del 5 de septiembre de 2018: Ajustes<br>requeridos, cambios cantidades. No cambia Alcance   |                             |
| Reformulación<br>No 2   | 24 de mayo de 2019: Ajustes requeridos por posibles<br>oferentes Proceso Contratación. No cambia Alcance  |                             |
| Reformulación<br>No 3   | 5 de marzo de 2021: Ajustes requeridos, cambios<br>cantidades. Adición Presupuesto PDA Municipio de Pitalito  |                             |



## SUSPENDIDO

**ESTADO  
ACTUAL:**

**Permiso de Aprovechamiento Forestal PAF (Obligación  
Municipio de Pitalito) Aprobado por CAM Res 1124 de 2022**

Se ha solicitado por parte de Contratista de Obra revisión de  
precios de los ítems afectados, mediante la activación de la  
fórmula de arreglo directo

Aprobación por parte de Interventoría

Aprobación por parte de FINDETER

**EN GESTIÓN DE RECURSOS PARA ADICIÓN**

**CUADRO COMPARATIVO VIABILIZACIÓN - REFORMULACIÓN 2 - REFORMULACIÓN 3 Vs REFORMULACIÓN 4  
RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA - FASE II"**

| OBRA CIVIL + SUMINISTROS                                    | REFORMULACIÓN           | REFORMULACIÓN 3         | REFORMULACIÓN 4         |                         | DIFERENCIAS            |                        |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 2                       | TUBERÍAS HD             | HD                      | HD - GRP                | R3 vs R4 HD            | R3 vs R4 HD - GRP      |
| 1 OPTIMIZACIÓN BOCATOMA (Qmáx.=927 l/s)                     | \$19.907.917            | \$49.873.809            | \$71.504.335            | \$71.504.335            | \$21.630.526           | \$21.630.526           |
| 2 ADUCCIÓN TRAMO 1 (Qmáx.=798 l/s)                          | \$167.310.646           | \$144.314.464           | \$178.715.418           | \$178.715.418           | \$34.400.954           | \$34.400.954           |
| 3 CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES 1                      | \$175.619.785           | \$319.715.334           | \$393.852.585           | \$393.852.585           | \$74.137.251           | \$74.137.251           |
| 4 DESARENADOR (Q = 188 l/s)                                 | \$432.009.378           | \$671.428.198           | \$725.029.806           | \$725.029.806           | \$53.601.609           | \$53.601.609           |
| 5 CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES 2                      | \$88.341.560            | \$263.745.373           | \$365.578.137           | \$365.578.137           | \$101.832.764          | \$101.832.764          |
| 6 TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN                                 | \$156.447.721           | \$275.107.415           | \$305.052.354           | \$305.052.354           | \$29.944.940           | \$29.944.940           |
| 7 CERRAMIENTO DESARENADOR                                   | \$82.353.010            | \$73.918.958            | \$85.137.307            | \$85.137.307            | \$11.218.349           | \$11.218.349           |
| 8 ADUCCIÓN TRAMO 2 TUBERÍA Ø 24" Qmáx.=562,5 l/s            | \$12.611.654.561        | \$13.937.400.935        | \$17.751.910.154        | \$15.958.285.499        | \$3.814.609.220        | \$2.020.884.565        |
| 9 VIADUCTOS 120 m. (K3+202 y K9+723 )                       | \$218.954.021           | \$508.402.979           | \$711.040.816           | \$711.040.816           | \$202.637.837          | \$202.637.837          |
| 10 PASO ESPECIAL  | \$58.029.550            | \$108.914.607           | \$108.914.607           | \$108.914.607           | \$0                    | \$0                    |
| 11 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO LÍNEA DE ADUCCIÓN 2 Ø 24"     | \$173.856.030           | \$390.035.829           | \$774.762.641           | \$738.707.099           | \$384.726.812          | \$348.671.270          |
| 12 OPTIMIZACIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN EN ASBESTO CEMENTO DE 16" | \$1.172.373.935         | \$0                     | \$0                     | \$0                     | \$0                    | \$0                    |
| <b>TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS</b>                       | <b>\$15.356.858.116</b> | <b>\$16.742.857.901</b> | <b>\$21.471.498.160</b> | <b>\$19.641.817.963</b> | <b>\$4.728.640.260</b> | <b>\$2.898.960.063</b> |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| VALOR CONTRATO PAF-ATF-O-045-2019                  | \$ 15.356.858.116 | \$ 16.742.857.901                        |
| DIFERENCIAS vs VALOR CONTRATO                      | \$ 0              | \$ 0 -\$ 4.728.640.259 -\$ 2.898.960.062 |
| RECURSOS ASIGNADOS PLAN FINANCIERO REFORMULACIÓN 3 | \$ 17.791.226.888 | -3.680.271.272 -1.850.591.075            |



Aldcaldía Municipal  
Pitalito Huila



alcaldiapitalito.gov.co

Región que Vive

| AÑO  | DEMANDA (L/s) | OFERTA 10" (L/s) 0.011 | OFERTA L12" (L/s) 0.011 | OFERTA 16" (L/s) 0.011 | OFERTA TOTAL (L/s) 0.011 | DÉFICIT 0.011 | SUPERÁVIT |
|------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 2013 | 241.59        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 175.24    |
| 2014 | 265.17        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 151.66    |
| 2015 | 288.30        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 128.53    |
| 2016 | 311.08        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 105.75    |

Carretera 70 A No 104-51 Bogotá D.C. Barrio Morato. Tel. (1) 8027452 Cel. 310.6018623  
[www.inalcon.com](http://www.inalcon.com) - [gerencia@inalcon.com](mailto:gerencia@inalcon.com)

9

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>CONTRATO No. 212 DE 2012</b><br><b>DISEÑOS DEFINITIVOS DEL COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b> |  |
|--|--|---|

| AÑO  | DEMANDA (L/s) | OFERTA 10" (L/s) 0.011 | OFERTA L12" (L/s) 0.011 | OFERTA 16" (L/s) 0.011 | OFERTA TOTAL (L/s) 0.011 | DÉFICIT 0.011 | SUPERÁVIT |
|------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 2017 | 333.62        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 83.21     |
| 2018 | 342.33        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 74.50     |
| 2019 | 351.26        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 65.57     |
| 2020 | 360.43        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 56.40     |
| 2021 | 369.84        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 46.99     |
| 2022 | 379.49        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 37.34     |
| 2023 | 389.40        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 27.43     |
| 2024 | 399.56        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 17.27     |
| 2025 | 409.99        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | 0.00          | 6.84      |
| 2026 | 420.69        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | -3.86         | 0.00      |
| 2027 | 431.67        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | -14.84        | 0.00      |
| 2028 | 442.94        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | -26.11        | 0.00      |
| 2029 | 454.50        | 68.41                  | 111.20                  | 237.22                 | 416.83                   | -37.67        | 0.00      |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>CONTRATO No. 212 DE 2012</b><br><b>DISEÑOS DEFINITIVOS DEL COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b> |  |
|--|--|--|

| Año  | Tasa Ajustada al 2,5% | Caudal máximo diario (l/s) | Capacidad Existente Almacenamiento (m³) | Volumen de regulación requerido (m³) | Duración de incendio (Horas) | Q incendio (m³/s) | V incendio (m³) | Volumen de diseño (m³) | Déficit (m³) |
|------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------|
|      | Pob. Total P + PF     |                            |   |                                      |                              |                   |                 |                        |              |
| 2039 | 184866                | <b>588.07</b>              | 1095.42                                 | 12702.27                             | 2                            | 0.76              | 2720.81         | 12702.27               | -11606.84    |
| 2040 | 189691                | <b>603.42</b>              | 1095.42                                 | 13033.80                             | 2                            | 0.76              | 2750.46         | 13033.80               | -11938.37    |
| 2041 | 194642                | <b>619.17</b>              | 1095.42                                 | 13373.98                             | 2                            | 0.77              | 2780.36         | 13373.98               | -12278.56    |
| 2042 | 199722                | <b>635.33</b>              | 1095.42                                 | 13723.03                             | 2                            | 0.78              | 2810.49         | 13723.03               | -12627.61    |
| 2043 | 204935                | <b>651.91</b>              | 1095.42                                 | 14081.22                             | 2                            | 0.79              | 2840.85         | 14081.22               | -12985.80    |
| 2044 | 210284                | <b>668.92</b>              | 1095.42                                 | 14448.76                             | 2                            | 0.80              | 2871.45         | 14448.76               | -13353.33    |

**Tabla 4.8.** Balance entre Oferta y Demanda: Almacenamiento  
 Fuente. Consorcio Aguas del Huila, 2014

Por tanto existe un déficit para el periodo de diseño de 13353.33 m³ y tal como lo manifiesta La Empresa de Servicios Públicos de Pitalito EMPITALITO ESP "la capacidad de almacenamiento es deficiente, se requiere la construcción de nuevos tanques con el fin de garantizar el servicio por 24 horas".

| DIÁMETRO (pulg)  | 18     | 20     | 24    | 27    |
|------------------|--------|--------|-------|-------|
| TUBERÍA CCP      | 0.610  | 0.343  | 0.553 | 0.753 |
| Q excede déficit | -0.159 | -0.076 | 0.134 | 0.334 |
| TUBERÍA GRP      | 0.292  | 0.385  | 0.621 | 0.844 |
| Q excede déficit | -0.127 | -0.034 | 0.202 | 0.425 |
| TUBERÍA HD       | 0.265  | 0.349  | 0.563 | 0.766 |
| Q excede déficit | -0.154 | -0.070 | 0.144 | 0.347 |

**Tabla 4.14.** Análisis preliminar de la Capacidad de la aducción (m³/s).  
 Fuente. Consorcio Aguas del Huila, 2014



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región que Vive



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región **que Vive**



|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>FECHA INICIO:</b>        | AGOSTO 2 DE 2019      |
| <b>SUSPENSIÓN No 1:</b>     | MARZO 24 DE 2020      |
| <b>REINICIO No 1:</b>       | JULIO 22 DE 2020      |
| <b>SUSPENSIÓN No 2:</b>     | AGOSTO 4 DE 2020      |
| <b>REINICIO No 2:</b>       | OCTUBRE 13 DE 2020    |
| <b>SUSPENSIÓN No 3:</b>     | DICIEMBRE 23 DE 2020  |
| <b>REINICIO No 3:</b>       | ABRIL 20 DE 2021      |
| <b>SUSPENSIÓN No 4:</b>     | MAYO 7 DE 2021        |
| <b>REINICIO No 4:</b>       | JUNIO 21 DE 2021      |
| <b>SUSPENSIÓN No 5:</b>     | JULIO 13 DE 2021      |
| <b>REINICIO No 5:</b>       | AGOSTO 13 DE 2021     |
| <b>SUSPENSIÓN No 6:</b>     | SEPTIEMBRE 10 DE 2021 |
| <b>REINICIO No 6:</b>       | SEPTIEMBRE 17 DE 2021 |
| <b>SUSPENSIÓN No 7:</b>     | DICIEMBRE 10 DE 2021  |
| <b>REINICIO No 7:</b>       | MARZO 8 DE 2022       |
| <b>ACTA DE TERMINACIÓN:</b> | MARZO 11 DE 2022      |
| <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN:</b> |                       |





Antes



Después



# LA NACIÓN

LA NOTICIA INDEPENDIENTE



## DATOS

88.666

Las cifras del COVID-19

casos en el Huila



5.034.266

casos en el país



127.833

muerres confirmadas



4.874.808

personas recuperadas



## El elefante blanco que sale de la 'lista roja'



Por fin, después de siete años de prolongada espera, el municipio de Pitalito tendrá el velódromo, un centro deportivo de alto rendimiento para la práctica de ciclismo de velocidad con proyección olímpica en el sur del Huila. El proyecto, que debió entregarse totalmente finalizado en diciembre de 2014, terminó costando \$7.781 millones. Pág. 4 y 5

### Cayó disidente que protagonizó fuga


Las autoridades localizaron a Elias 'Nani', el disidente de las Farc que en junio pasado se fugó, como de palacio, de la UCE de la Piedad en Huila. Fue abatido matándolo tras ser atacado a balazos por soldados armados en medio de una fiesta en Ica, departamento del Cauca. Pág. 7

### Timaná: otro crimen en cuatro días

Un nuevo homicidio se registró anoche en Timaná. Se son dos los asesinatos a balazos que se presentaron en este municipio del sur del Huila en menos de cuatro días bajo la misma modalidad: los agresores dejaron en las víctimas un puntito a nombre del 'E.P.L.' Pág. 23

### "Cada esfuerzo tiene su recompensa"

La señora Nidia Karen Julián Cortés Díaz tuvo una feliz presentación en el Concurso Nacional de Bailatas al ocupar el puesto de primera princesa. Su diálogo con LA NACIÓN aseguró que aunque su objetivo era la corona, está muy feliz con el resultado. La balada viajó a Tuluanda. Pág. 12 y 13

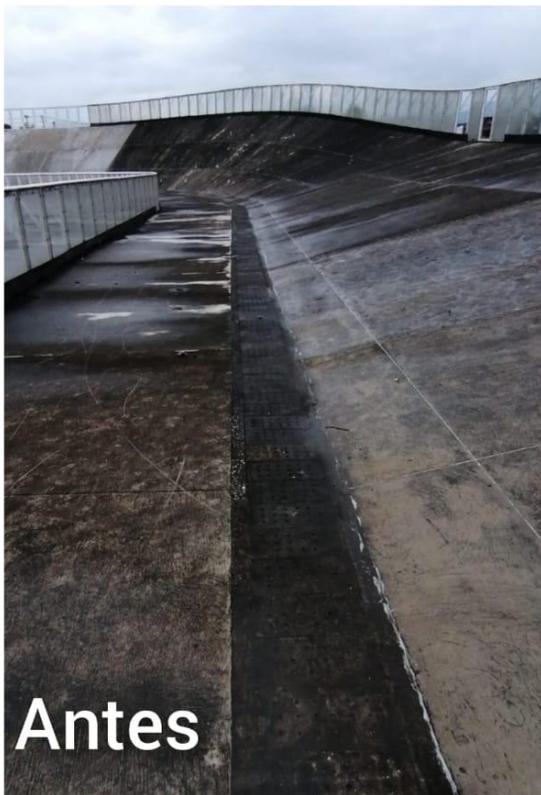

Antes



Hoy



Alcaldía Municipal Pitalito Huila




alcaldiapitalito.gov.co

Región que Vive

# TERMINADO

**ESTADO  
ACTUAL:**

Revisión de Observaciones ENTREGA OBRA  
Revisión de Cantidades de Ejecución Finales  
ACTA FINAL DE RECIBO DE OBRAS  
LIQUIDACIÓN DE OBRA

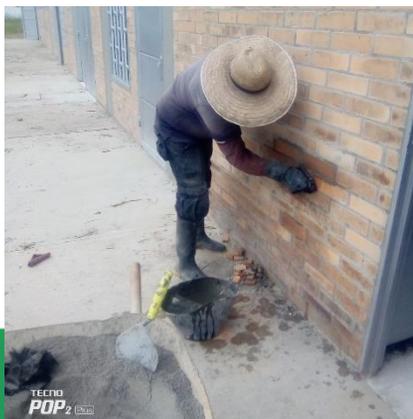

4 feb. 2022 9:19:14 a. m.

TECNO  
POP<sub>2</sub> (S.A.)

CO



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



alcaldiapit

# CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO ACCESO Y PUNTE VEHICULAR UBICADO EN LA CARRERA 6 SOBRE EL RIO GUARAPAS EN EL BARRIO LIBERTADOR MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| CONTRATO OBRA:                               | 445 de 2019  | EJECUCIÓN |
| CONTRATISTA:                                 | CONSORCIO PUNTE GUARAPAS.<br>R/L. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO  | 32%       |
| CONTRATO INTERVENTORÍA:                      | 369 de 2019  |           |
| INTERVENTOR:                                 | CONSORCIO PUNTE GUARAPAS.<br>R/L. CRISTIAN RAMIREZ SAAVEDRA  |           |
| OBJETO:                                      | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO ACCESO Y PUNTE VEHICULAR UBICADO EN LA CARRERA 6 SOBRE EL RIO GUARAPAS EN EL BARRIO LIBERTADOR MUNICIPIO DE PITALITO HUILA |           |
| PLAZO INICIAL:                               | nueve (9) MESES  |           |
| PLAZO FINAL:                                 | DOCE (12) MESES  |           |
| VALOR INICIAL:                               | 3.850.098.062  |           |
| ADICIONAL:                                   | 1.910.833.422  |           |
| VALOR FINAL:                                 | 5.760.931.484  |           |
| FECHA INICIO:                                | FEBRERO 12 DE 2020   |           |
| SUSPENSIÓN No 1:                             | MARZO 2 DE 2020  |           |
| REINICIO No 1:                               | DICIEMBRE 2 DE 2021  |           |
| ACTA MODIFICATORIA/A DICIÓN DINERO Y TIEMPO: | DICIEMBRE 30 DE 2021   |           |



**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 3.850.098.062,00

**MUNICIPIO:**  
FUENTE SGR FONDO DE COMPENSACION REGIONAL \$ 2.100.000.000,00



**DEPARTAMENTO:**  
FUENTE ASIGNACIONES DIRECTAS OCAD DEPARTAMENTO \$ 1.750.098.062,00

**VALOR ADICIONAL** \$ 1.910.833.422,00


**MUNICIPIO:**  
RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO \$ 1.196.000.000,00

**DEPARTAMENTO:**  
FUENTE ASIGNACIONES 20% DEPARTAMENTO DEL HUILA \$ 714.833.422,00

**VALOR TOTAL:** \$ 5.760.931.484,00

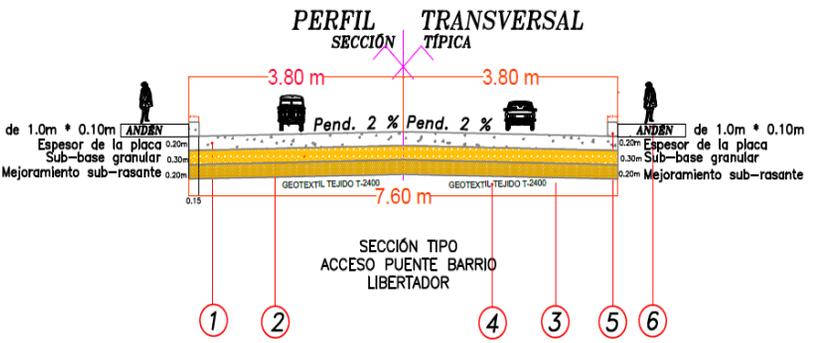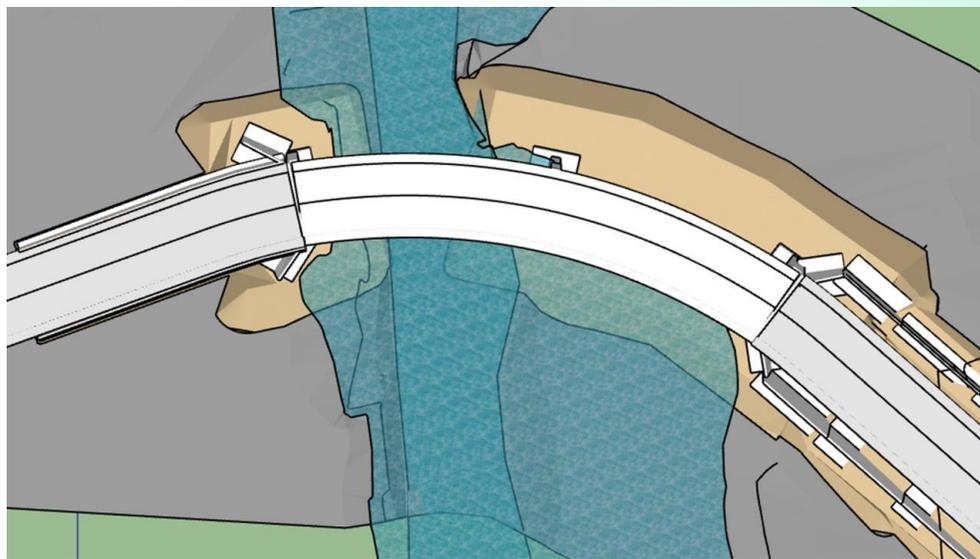

- 1 CONCRETO HIDRAULICO DE 4.2 MPA DE 0.20m DE ESPESOR
- 2 SUBBASE GRANULAR SBG-38 ESP 320-13 INV DE 0.30m DE ESPESOR
- 3 SUELO DE MEJORAMIENTO ESP 220-13 INV DE 0.20m DE ESPESOR
- 4 SUBRASANTE Y GEOTEXTIL TEJIDO T-2400
- 5 SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15x0.15 EN LOS BORDES EXTERNOS
- 6 ANDEN

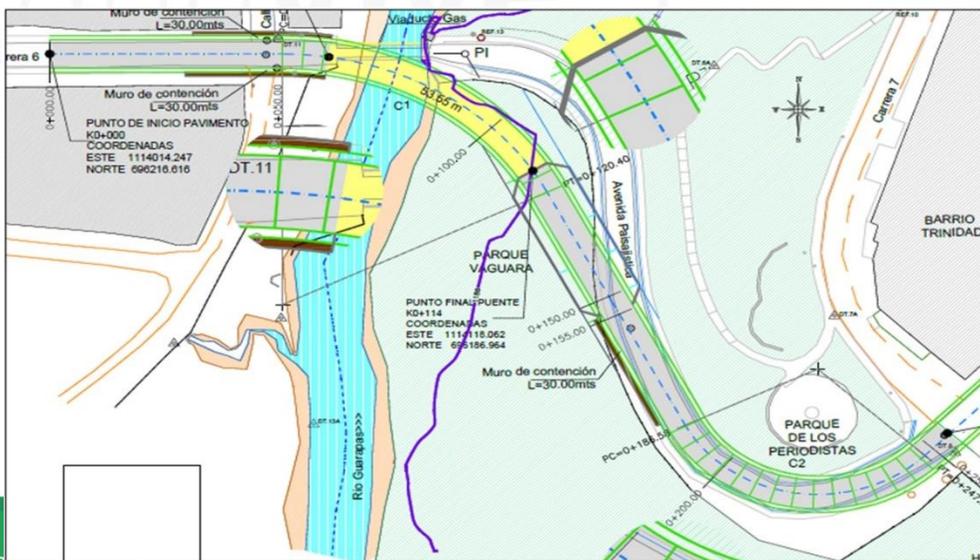

Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila






alcaldiapitalito.gov.co

Región de Huila

# EN EJECUCIÓN

**ESTADO  
ACTUAL:**

Inicio de Actividades de Construcción de  
PILOTES Cimentación  
Evaluación Vivienda Afectación Obra  
Evaluación Sitios de Disposición Escombros  
**CONTROL DE CRONOGRAMA DE  
ACTIVIDADES Y AVANCE DE OBRA**

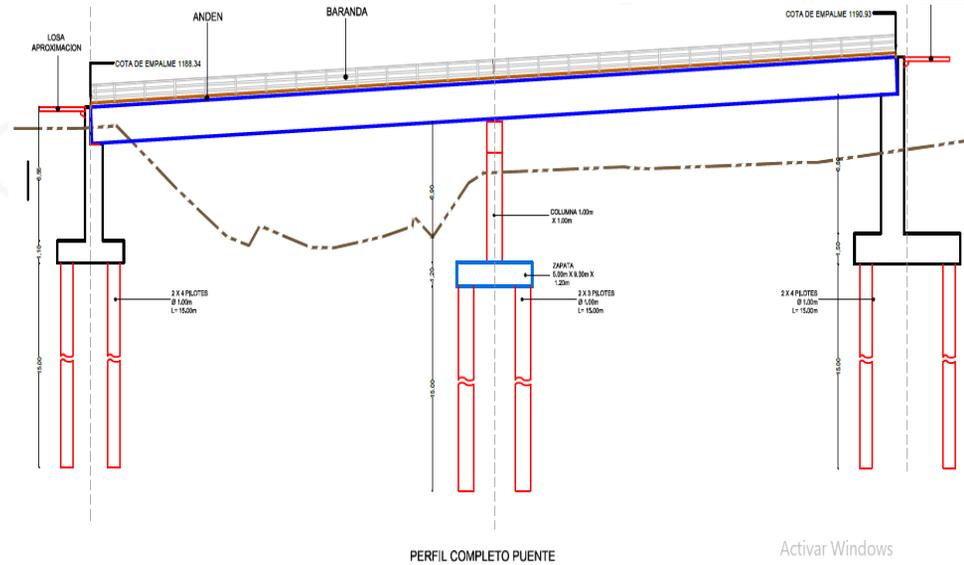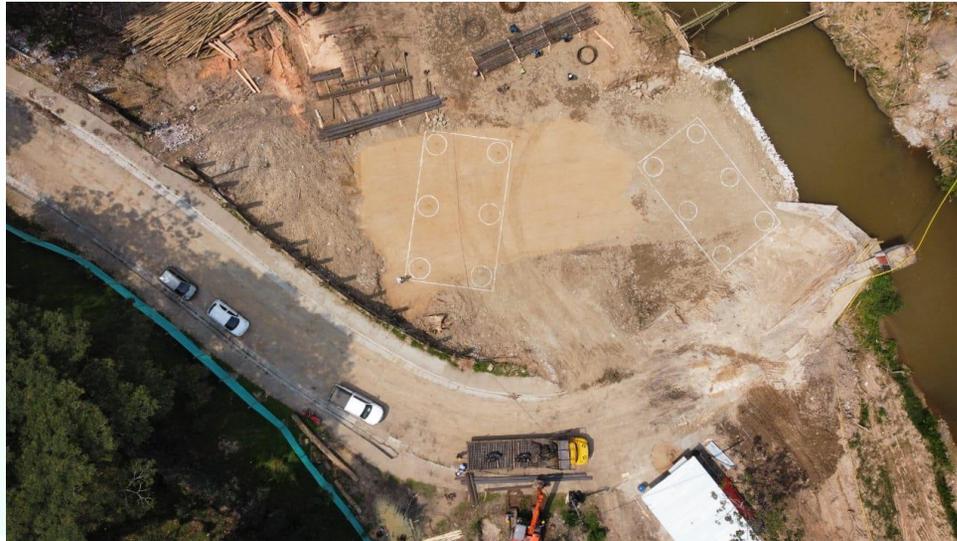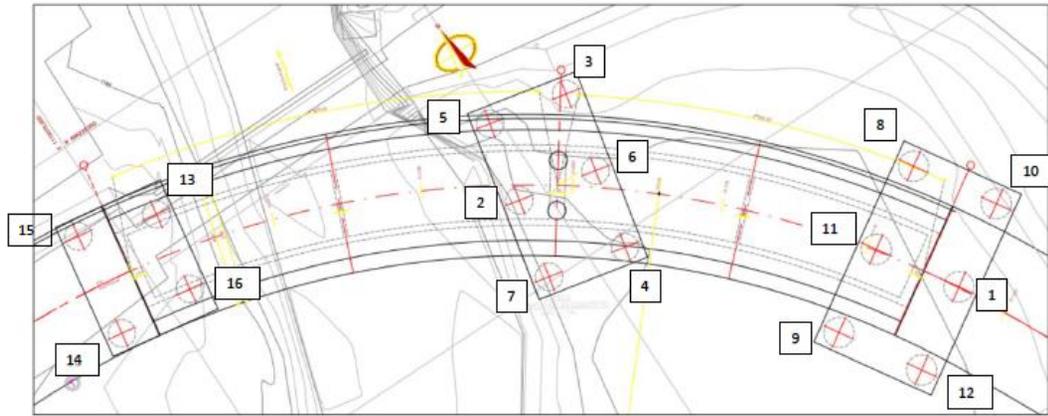

Activar Windows



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región que Vive



| PERIODO: 02 DE DICIEMBRE DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2022 |                     |
|--|---------------------|
| PROGRAMADO ACUMULADO                                   | EJECUTADO ACUMULADO |
| 8,018%   | 31,728%             |
| \$461.899.077,00                                       | \$1.827.805.222,00  |

**NOVEDADES Y OBSERVACIONES:** Se realiza la terminación de la excavación, instalación de acero y vaciado de concreto  $f'c=28$  MPa de los 12 pilotes que conforman los ejes 2 y 3.

De acuerdo con la reprogramación No. 1, el proyecto tiene un porcentaje programado acumulado de 8,018% y un porcentaje de ejecución acumulado de 31,728%, por lo que se concluye que no presenta atraso.



6/05/2022 10:10:32 a. m.  
 1°51'1,76818"N -76°2'46,87285"W  
 Cra. 3 #484, Pitalito, Huila, Colombia



REDMI NOTE 9 PRO  
 CRISTIAN PIZZO

2022/3/11 17:49



Alcaldía Municipal  
 Pitalito Huila



alcaldiapitalito.gov.co

Región de Vive





Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región **GeVive**

# MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, VIAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| CONTRATO:        | 463 DE 2019  | EJECUCIÓN |
| CONTRATISTA:     | CONSORCIO PROSPERIDAD 2020   | 100%      |
| INTERVENTOR:     | CONSORCIO MSF080   |           |
| OBJETO:          | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS, VÍAS PARA LA PAZ, MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA |           |
| PLAZO INICIAL:   | ONCE (11) MESES  |           |
| PLAZO FINAL:     | TRECE (13) MESES   |           |
| VALOR INICIAL:   | 3.750.698.913,00   |           |
| VALOR ANTICIPO:  | 1.125.209.673,90   |           |
| VALOR ADICIONAL: | 510.717.474,00   |           |
| VALOR TOTAL:     | 4.261.416.387,00   |           |



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



alcaldiapitalito.gov.co

Región que Vive

## TERMINADO

**ESTADO  
ACTUAL:**

Categorización Placa Huellas  
Cierre Proyecto Sistema Regalías  
**Toma de Fotografías DRON**



Alcaldía Municipal  
**Pitalito Huila**

Google

| No | VEREDAS            | Corregimiento | Longitud (m) | Avance      | Alcantarillas |
|----|--------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1  | Aguas negras       | Regueros      | 310          | 100%        | 2             |
| 2  | La Estrella        | Charguayaco   | 300          | 100%        | 3             |
| 3  | Vegas de Alumbre   | Chillurco     | 300          | 100%        | 3             |
| 4  | La Portada         | Chillurco     | 400          | 100%        | 3             |
| 5  | Bombonal           | Bruselas      | 210          | 100%        | 2             |
| 6  | La Esperanza       | Bruselas      | 200          | 100%        | 1             |
| 7  | El Pensil          | Bruselas      | 200          | 100%        | 1             |
| 8  | El Carmen          | Bruselas      | 200          | 100%        | 2             |
| 9  | Betania-Santa Rosa | Palmarito     | 220          | 100%        | 2             |
|    | <b>TOTAL</b>       |               | <b>2340</b>  | <b>100%</b> | <b>19</b>     |



9/12/2021 4:20:43 p. m.  
1°45'11,77081"N -76°11'57,99001"W  
#REGIONQUEVIVE



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



alcaldi


ive

# CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA PRADERA, LOS ROSALES, LOS NOGALES Y PARAÍSO MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO DE OBRA: | 493 de 2020  | EJECUCIÓN |
| CONTRATISTA:                           | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO "EMPITALITO E.S.P. | 66%       |
| CONTRATO INTERVENTORIA:                | 235 de 2021  |           |
| INTERVENTOR:                           | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA  |           |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| OBJETO:                           | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA PRADERA, LOS ROSALES, LOS NOGALES Y PARAÍSO MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA   |
| Acuerdo 036 de 28 de Mayo de 2020 | Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR" OCAD Municipios Ribereños del Rio Grande de la Magdalena y Canal del Dique, designa como instancia publica para la contratación de interventoría a la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA y como entidad ejecutora del proyecto al Municipio de Pitalito |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| PLAZO INICIAL: | QUINCE (15) MESES |
| VALOR INICIAL: | 5.976.131.623     |

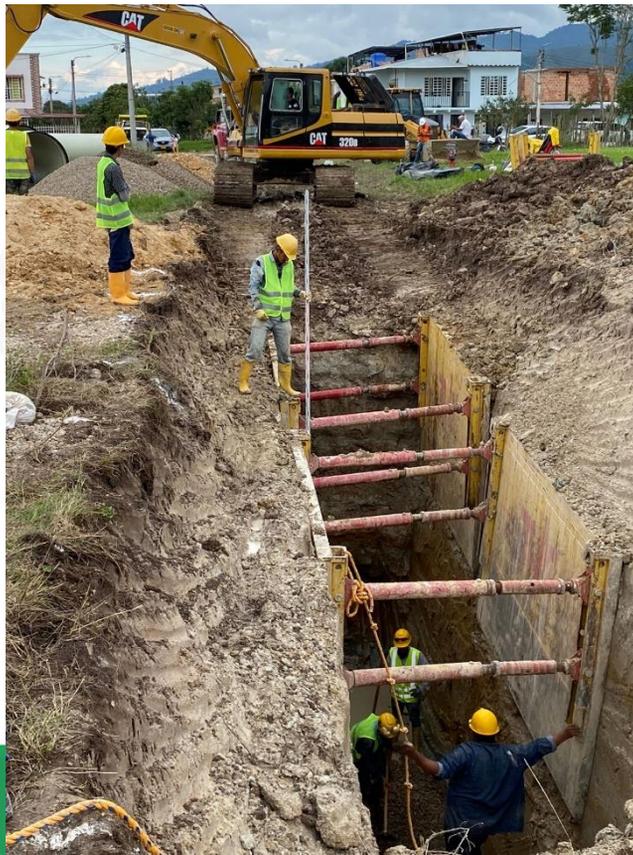

## EN EJECUCIÓN

**ESTADO  
ACTUAL:**

Actividades de Construcción de colectores Carrera  
9 Este (Tubería 60")

Actividades de Construcción de Descole  
Evaluación de Trayecto frente a Barrio Bosques de  
las Orquideas

**EN TRÁMITE ADICIÓN DE RECURSOS POR  
AJUSTE (Recursos Regalías Cormagdalena)**



| ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN  | VALOR INICIAL TOTAL APROBADO | VALOR AJUSTE ARITMETICO (1) | VALOR DE AJUSTE SOLICITADO (2) | VALOR TOTAL PROPUESTO CON AJUSTE (3=1+2) |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| CORMAGDALENA-SGR-<br>Corporación Autónoma<br>Regional del Rio Grande de la<br>Magdalena<br>(2020) | \$ 5.976.131.623             | \$ 5.976.129.033            | \$ 0                           | \$ 5.976.129.033                         |
| CORMAGDALENA-SGR-<br>Corporación Autónoma<br>Regional del Rio Grande de la<br>Magdalena<br>(2022) | \$ 0                         | \$ 0                        | \$ 1.191.283.140               | \$ 1.191.283.140                         |
| Total, recursos SGR   | \$ 5.976.131.623             | \$ 5.976.129.033            | \$ 1.191.283.140               | \$ 7.167.412.173                         |
| <b>Total, general</b>   | <b>\$ 5.976.131.623</b>      | <b>\$ 5.976.129.033</b>     | <b>\$ 1.191.283.140</b>        | <b>\$ 7.167.412.173</b>                  |



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



alcaldiapitalito.gov.co

Región **QueVive**



# CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO Y CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA HIGUERON, CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO OBRA: | 531 de 2020   | EJECUCIÓN |
| CONTRATISTA:                        | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO "EMPITALITO E.S.P.  | 100%      |
| OBJETO:                             | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO Y CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA HIGUERON, CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO, MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA |           |
| PLAZO INICIAL:                      | CUATRO (4) MESES  |           |
| PLAZO FINAL:                        | NUEVE (9) MESES   |           |
| VALOR INICIAL:                      | 169.504.546   |           |
| VALOR ADICIONAL:                    | 5.927.977   |           |
| VALOR FINAL:                        | 175.432.523   |           |





Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región **que Vive**

## SUSPENDIDO

**ESTADO  
ACTUAL:**

Revisión de Obras y pruebas hidraulicas para  
puesta en marcha Sistema de Acueducto  
Revisión de Cantidades de Ejecución Finales  
Acta Aclaratoria Deducciones Contrato  
interadministrativo  
Proceso de Refrendación de Reservas  
Presupuestales



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



alcaldiapita

ondeVive

# “CONSTRUCCIÓN BOCATOMA, DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELLA VISTA CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA (FASE I)”

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO OBRA: | 270 de 2021   | EJECUCIÓN |
| CONTRATISTA:                        | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO “EMPITALITO E.S.P.  | 0%        |
| OBJETO:                             | “CONSTRUCCIÓN BOCATOMA, DESARENADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELLA VISTA CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA (FASE I)” |           |
| PLAZO INICIAL:                      | CINCO (5) MESES   |           |
| VALOR INICIAL:                      | 148.192.262   |           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ESTADO ACTUAL:</b> | <b>SUSPENDIDO</b>   |
|                       | Revisión de Diseño y Chequeo de Ajustes<br>Revisión de Cantidades de Ejecución Finales y Evaluación de Adición de Recursos (Viaductos)<br>Acta Aclaratoria Deducciones Contrato interadministrativo<br>Proceso de Refrendación de Reservas Presupuestales |



# EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE GLORIETA SAN ANTONIO UBICADA EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 10 Y AVENIDA LOS GUADUALES, DEL MUNICIPIO DE PITALITO

|                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO OBRA: | <b>532 de 2021</b>  | EJECUCIÓN  |
| CONTRATISTA:                        | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO "EMPITALITO E.S.P.  | <b>60%</b> |
| OBJETO:                             | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE GLORIETA SAN ANTONIO UBICADA EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 10 Y AVENIDA LOS GUADUALES, DEL MUNICIPIO DE PITALITO. |            |
| PLAZO INICIAL:                      | CUATRO (4) MESES  |            |
| PLAZO FINAL:                        | OCHO (8) MESES  |            |
| VALOR INICIAL:                      | 74.946.974  |            |
| FECHA INICIO:                       | NOVIEMBRE 11 DE 2021  |            |
| ACTA DE TERMINACIÓN:                |   |            |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN:                |   |            |





Actividad 6. Reforzar la estructura civil sobre el perímetro del cristo (18 m2)



Registro Fotográfico.

Actividad 1. Descargue del material de adoquín rojo 12.000 unidades y loseta 1200 unidades.



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila




[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región **queVive**

# CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| CONTRATO DE OBRA: | 537 de 2021   | EJECUCIÓN |
| CONTRATISTA:      | ISAIAS VARGAS GONZALES  |           |
|                   |   | 95%       |
| OBJETO:           | CONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO |           |
| PLAZO INICIAL:    | DOS (2) MESES   |           |
| PLAZO FINAL:      | CUATRO (4) MESES  |           |
| VALOR INICIAL:    | 144.250.101   |           |

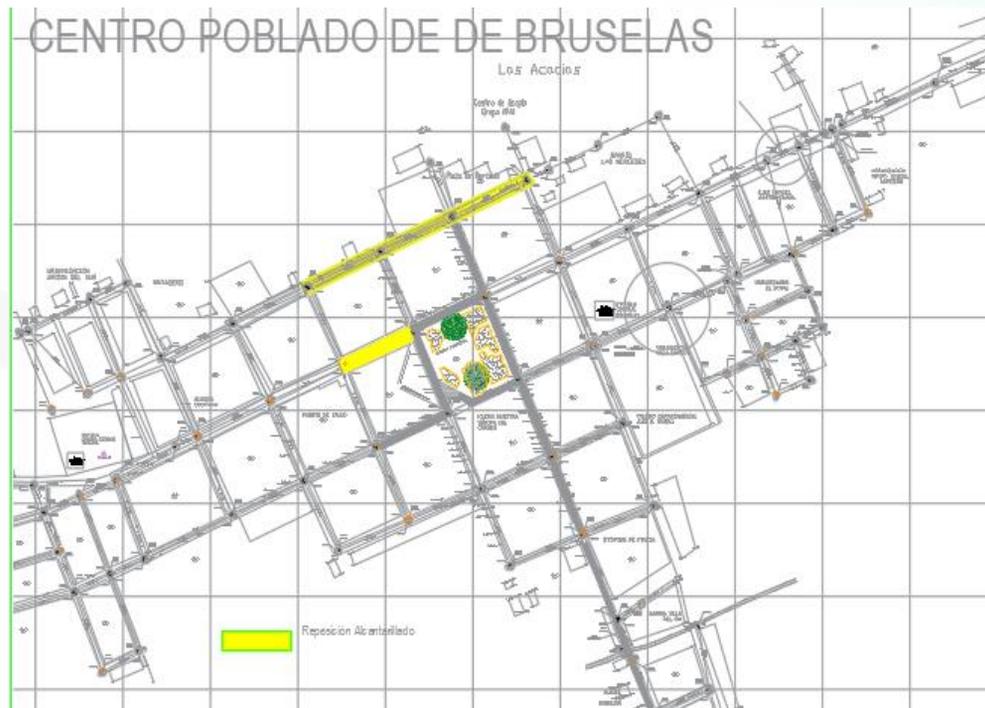

|                |  |
|----------------|--|
| ESTADO ACTUAL: | <b>SUSPENDIDO</b>  |
|                | Revisión de Cantidades de Ejecución Finales<br>Adición de Recursos<br>Proceso de Refrendación de Reservas Presupuestales |



# AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA, EN VEREDAS DE INTERES CAFETEROS

|                                |   |                  |
|--------------------------------|---|------------------|
| CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO: | <b>CN 2021 - 1161</b>   | <b>EJECUCIÓN</b> |
| CONTRATISTA:                   | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS - COMITÉ DE CAFETEROS DEPARTAMENTAL  | <b>100%</b>      |
| OBJETO:                        | <b>AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA, EN VEREDAS DE INTERES CAFETEROS</b> |                  |
| PLAZO INICIAL:                 | TRES (3) MESES  |                  |
| PLAZO FINAL:                   | SEIS (6) MESES  |                  |
| APORTE MUNICIPIO:              | 1.000.000.000,00  |                  |
| APORTE COMITÉ DE CAFETEROS:    | 549.952.153,00  |                  |
| <b>VALOR TOTAL:</b>            | <b>1.549.952.153,00</b>   |                  |
| FECHA INICIO:                  | OCTUBRE 1 DE 2021   |                  |
| ACTA MODIFICATORIA:            | NOVIEMBRE 26 DE 2021  |                  |
| FECHA TERMINACIÓN:             | MARZO 31 DE 2021  |                  |



## TERMINADO

**ESTADO  
ACTUAL:**

Visita a Obras terminadas  
Liquidación Convenio  
**Toma de Fotografías DRON**

| No. | Vereda                          | Corregimiento | Longitud (ML) | Ancho (ML) |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 1   | Higuerón (Sector el Ventilador) | Charguayaco   | 100           | 4.5        |
| 2   | El Triunfo                      | Charguayaco   | 100           | 4.5        |
| 3   | Paraíso Charguayaco             | Charguayaco   | 100           | 4.5        |
| 4   | San Martin                      | Palmarito     | 200           | 4.5        |
| 5   | 7 De Agosto                     | La Laguna     | 100           | 4.5        |
| 6   | El Jardín (Sector Filo Seco)    | Criollo       | 100           | 4.5        |
| 7   | El Recuerdo                     | Criollo       | 100           | 4.5        |
| 8   | La Esmeralda                    | Bruselas      | 100           | 4.5        |
| 9   | Kennedy (Sector La Batea)       | Bruselas      | 100           | 4.5        |
| 10  | Buenos Aires                    | Guacacallo    | 100           | 4.5        |
| 11  | El Diamante                     | Bruselas      | 100           | 4.5        |
| 12  | El Girasol                      | Chillurco     | 100           | 4.5        |
| 13  | Altos Del Magdalena             | Chillurco     | 150           | 4.5        |
| 14  | Alto Pinos                      | Chillurco     | 100           | 4.5        |
| 15  | San Luis                        | Regueros      | 100           | 4.5        |
|     |                                 |               | <b>1650</b>   |            |



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



alcaldiapitalito.gov.co



Región que Vive

# MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| CONTRATO OBRA:          | 281 de 2021  | EJECUCIÓN |
| CONTRATISTA:            | CONSORCIO COLOMBIA<br>21 - R.L. ALVARO JOSÉ<br>MUÑOZ JAIME   |           |
| CONTRATO INTERVENTORÍA: | 394 de 2021  |           |
| INTERVENTOR:            | UNION TEMPORAL VIAS<br>FUTURO - R.L. YULY<br>ANDREA LOPEZ GARCÍA   |           |
| OBJETO:                 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA |           |
| PLAZO INICIAL:          | DIEZ(10) MESES   | 51%       |
| VALOR INICIAL:          | 7.209.951.179  |           |
| CESIÓN DEL CONTRATO:    | AGOSTO 20 DE 2021  |           |
| FECHA INICIO:           | NOVIEMBRE 2 DE 2021  |           |
| ACTA DE TERMINACIÓN:    |  |           |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN:    |  |           |



| ESTADO ACTUAL: | EJECUCIÓN   |   |                 |  |
|----------------|---|---|-----------------|--|
|                | Actividades de construcción de Pavimentos en 7 Frentes de Trabajo |   |                 |  |
| No Cuadras     | BARRIO  |   | EJECUCIÓN       | DIRECCIONES  |
| 8              | LAS AMÉRICAS  | X | TERMINADA       | CALLE 6B ENTRE TRANSVERSALES 20 Y 21 - TRANSVERSAL |
| 2              | DIVINO NIÑO - LOS CRISTALES                                       | X | TERMINADA       | CALLE 10 ENTRE CARRERAS 18 Y 19                    |
| 3              | BRISAS DEL GUARAPAS   | X | TERMINADA       | CALLE 1 ENTRE CARRERAS 15 Y 16A                    |
| 2              | LEÓN TRECE  | X | TERMINADA       | CARRERA 1A ESTE ENTRE DIAG. 3 SUR Y CRA 2 ESTE -   |
| 1              | LARA BONILLA  | X | TERMINADA       | CALLE 26A ENTRE CALLES 11 Y 12                     |
| 4              | LA GAITANA  | X | TERMINADA       | CARRERA 11B ESTE, CALLE 3B, CARRERA 11A ESTE,      |
| 4              | MADELENA  | X | TERMINADA       | CALLE 23 SUR ENTRE CARRERAS 3 Y TRANSVERSAL 2 -    |
| 3              | SAN ANTONIO   | X | FUNDICIÓN PLACA | CALLE 12 ENTRE CARREAS 8 Y 10A                     |
| 6              | PORVENIR, VILLA DEL PRADO, 13 DE AGOSTO, 1 DE MAYO                | X | TERMINADA       | CARRERA 13 ENTRE CALLES 13 Y 15A                   |
| 3              | LAS VILLAS  | X | FUNDICIÓN PLACA | CALLE 2 ENTRE CARRERAS 4A ESTE Y 2 ESTE            |
| 1              | LOS LAGOS   | X | SUBBASE         | CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 2                       |
| 1              | CAMBULOS  |   | SUBBASE         | CARRERA 3A ESTE ENTRE CALLES 11 Y 13               |
| 1              | LOS NARANJOS  |   | SUBBASE         | CARRERA 3 ESTE ENTRE CALLES 13 Y 14                |
| 1              | ANTONIO NARANJO   |   | SUBBASE         | CARRERA 4B ESTE ENTRE CALLES 14 Y 14B              |
| 2              | SAN ANDRÉS  |   | MEJORAMIENTO    | CARRERA 5 ESTE ENTRE CARRERA 14 Y 15               |
| 1              | SAN ANDRÉS  |   | MEJORAMIENTO    | CARRERA 6 ESTE ENTRE CALLES 14A Y 15               |
| <b>42</b>      |   |   | <b>57%</b>      | AVANCE DE INTERVENCIÓN CUADRAS                     |
|                |   |   | <b>51%</b>      | AVANCE DE FÍSICO DE OBRAS                          |




| COMUNA       | TRAMOS    | TRAMOS TERMINADOS | Porcentaje de avance | No de Cuadras | No de Cuadras Terminadas | Porcentaje de avance |
|--------------|-----------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| COMUNA 1     | 11        | 6                 | 55%                  | 29            | 20                       | 69%                  |
| COMUNA 2     | 21        | 10                | 48%                  | 28            | 15                       | 54%                  |
| COMUNA 3     | 5         | 1                 | 20%                  | 10            | 3                        | 30%                  |
| COMUNA 4     | 5         | 3                 | 60%                  | 7             | 4                        | 57%                  |
| <b>Total</b> | <b>42</b> | <b>20</b>         |                      | <b>74,0</b>   | <b>42,0</b>              |                      |

## EJECUCIÓN

Trámite un ajuste por mayores y menores cantidades de obra que han requerido un valor adicional para realizar a la obra, aprobado por interventoría y que está en proceso de aprobación por COMITÉ DE PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, LIBERACIÓN Y/O AJUSTE A PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, para adición al contrato de obra, que garantizará la ejecución total de las obras con las condiciones de calidad y funcionalidad.

**ESTADO ACTUAL:**

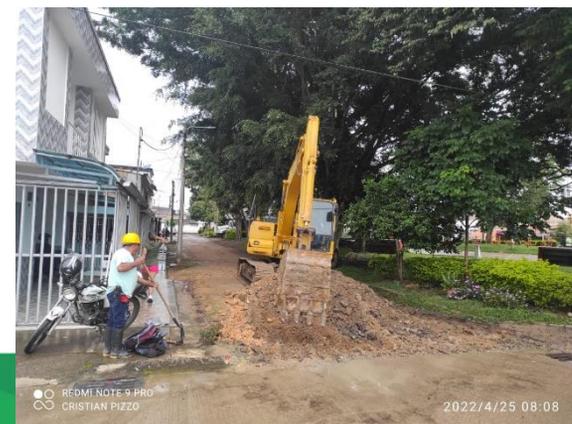

Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila

REDMI NOTE 9 PRO  
CRISTIAN PIZZO

2022/4/25 08:08

| No. | DIRECCION (PITALITO)                         | BARRIO               | COMUNA | Longitud (ml) | Ancho (ml) | Area Total (m2) | No de Cuadras |
|-----|--|----------------------|--------|---------------|------------|-----------------|---------------|
| 1   |  |                      |        |               |            |                 | 1             |
| 2   | CARRERA 17B ENTRE CALLES 1 Y 1A              | ALTOS DEL MAGDALENA  | 1      | 76,52         | 4,0        | 306,08          | 1             |
| 3   |  |                      |        |               |            |                 | 3             |
| 4   |  |                      |        |               |            |                 | 3             |
| 5   |  |                      |        |               |            |                 | 5             |
| 6   | CALLE 15 SUR ENTRE CARRERA 2 Y 4             | EL JARDÍN            | 4      | 180,00        | 6,0        | 1.080,00        | 2             |
| 7   | CARRERA 1 ENTRE CALLES 19 Y 20               | LA ISABELLA          | 2      | 94,00         | 6,7        | 629,80          | 1             |
| 8   | CARRERA 4B ESTE ENTRE CALLES 17 Y 17A        | VILLAS DE SAN CARLOS | 2      | 45,57         | 5,0        | 227,85          | 1             |
| 9   | CARRERA 3 ESTE ENTRE CALLES 17 Y 19          | VILLAS DE SAN CARLOS | 2      | 179,92        | 3,0        | 539,76          | 2             |
| 10  | CARRERA 9 ENTRE CALLES 15 Y 17               | GUADUALES            | 3      | 112,59        | 4,5        | 506,66          | 2             |
| 11  |  |                      |        |               |            |                 | 6             |
| 12  |  |                      |        |               |            |                 | 1             |
| 13  |  |                      |        |               |            |                 | 1             |
| 14  | CALLE 3A SUR ENTRE CARRERAS 7 ESTE Y 8A ESTE | LOS ROSALES          | 2      | 100,71        | 7,0        | 704,97          | 1             |
| 15  |  |                      |        |               |            |                 | 3             |
| 16  |  |                      |        |               |            |                 | 2             |
| 17  | CALLE 16 ENTRE CARRERAS 3 ESTE Y 2 ESTE      | TIMANCO              | 2      | 66,83         | 6,0        | 400,98          | 1             |
| 18  | CARRERA 2 ESTE CON INTERSECCIÓN CALLE 16     | TIMANCO              | 2      | 56,33         | 4,0        | 225,32          | 1             |
| 19  |  |                      |        |               |            |                 | 3             |
| 20  |  |                      |        |               |            |                 | 4             |
| 21  | CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9A Y 10              | SAN ANTONIO          | 3      | 77,24         | 5,5        | 424,82          | 1             |

|    |   |                       |   |        |     |          |  |         |      |
|----|---|-----------------------|---|--------|-----|----------|--|---------|------|
|    |   |                       |   |        |     |          |  | 1       |      |
|    |   |                       |   |        |     |          |  | 2       |      |
|    |   |                       |   |        |     |          |  | 1       |      |
| 25 | CARRERA 2A ESTE ENTRE CALLES 20 Y 21            | LOS LAURELES          | 2 | 88,00  | 5,0 | 440,00   |  | 1       |      |
|    |   |                       |   |        |     |          |  | 1       |      |
|    |   |                       |   |        |     |          |  | 1       |      |
| 28 | CALLE 6B ENTRE CARRERAS 4 ESTE Y 5 ESTE         | EDEN II               | 2 | 120,00 | 4,5 | 540,00   |  | 1       |      |
|    |   |                       |   |        |     |          |  | 1       |      |
| 30 | CARRERA 9A ENTRE CALLES 14A Y 15                | GUADUALES             | 3 | 112,39 | 5,0 | 561,95   |  | 2       |      |
|    |   |                       |   |        |     |          |  | 2       |      |
| 32 | CARRERA 13A ENTRE CALLES 7 Y 8                  | CÁLAMO I ETAPA        | 1 | 85,68  | 7,0 | 599,76   |  | 1       |      |
| 33 | CALLE 8 ENTRE CARRERAS 15 Y 13                  | CÁLAMO I ETAPA        | 1 | 195,00 | 7,0 | 1.365,00 |  | 3       |      |
| 34 | CALLE 8 ENTRE CARRERAS 13, CARRERA 12 Y CALLE 9 | CÁLAMO I ETAPA        | 1 | 130,00 | 4,0 | 520,00   |  | 3       |      |
| 35 | CARRERA 19 ENTRE CALLES 2 Y 2A                  | SIMON BOLIVAR         | 1 | 68,00  | 6,0 | 408,00   |  | 1       |      |
| 36 | CARRERA 7 ESTE ENTRE CALLES 2 Y 3               | VENECIA               | 2 | 78,80  | 5,0 | 394,00   |  | 1       |      |
| 37 | CARRERA 4A ENTRE CALLES 8 SUR Y 9 SUR           | COLINAS DE LA TERRAZA | 4 | 77,65  | 6,0 | 465,90   |  | 1       |      |
| 38 | CARRERA 10 ENTRE CALLES 13 Y 14A                | SAN ANTONIO           | 3 | 164,51 | 4,5 | 740,30   |  | 2       |      |
| 39 | CARRERA 3 ESTE ENTRE CALLES 14B Y 15            | ANTONIO NARANJO       | 2 | 52,96  | 6,0 | 317,76   |  | 1       |      |
|    |   |                       |   |        |     |          |  | 1       |      |
|    |   |                       |   |        |     |          |  | 1       |      |
| 42 | CALLE 2 ESTE ENTRE CARRERAS 6 ESTE Y 7 ESTE     | VENECIA               | 2 | 46,80  | 6,0 | 280,80   |  | 1       |      |
|    |   |                       |   |        |     |          |  |         |      |
|    |   |                       |   |        |     | 4799,3   |  | 27212,0 | 74,0 |





Antes



Antes



Después



Después



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región **de** Vive

# Alcaldía de Pitalito avanza en la pavimentación de las primeras 74 cuadras proyectadas en el municipio



Región que Vive



**Esto representa un 20% del total de sectores que están siendo intervenidos en el casco urbano de Pitalito.**

La Alcaldía de Pitalito, en cabeza del mandatario Edgar Muñoz Torres y junto al secretario de Infraestructura Cristian Fabián Pizzo Scalante, se encuentra adelantando la pavimentación de 74 cuadras en el sector urbano del Valle de Laboyos con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad y la transitabilidad en los

sectores.

Es así que a la fecha el municipio registra 5 frentes de trabajo en 5 sectores:

- Dos Sectores en Las Américas, con 3 cuadras finalizadas y 5 en labores a nivel sub base.
- Un sector en el barrio Divino Niño con 2 cuadras, en donde en este momento se está finalizando la fundición de la placa de concreto.
- Un sector en Brisas del Gua-

rapas, con 3 cuadras terminando actividades de construcción de sub base.

- Uno sector en el barrio León XIII, en donde se está finalizando el trabajo de excavación.

En ese sentido, la Administración Municipal, bajo la coordinación de la Secretaría de Infraestructura, trabaja en 15 de las 74 cuadras en total, con lo cual se estaría llegando a alrededor de 18% de avance de obra.

El ingeniero Cristian Pizzo aseguró que un día antes de iniciar la pavimentación en cada cuadra, su equipo de trabajo se reúne con la comunidad para socializar las recomendaciones técnicas para que la población esté al tanto y acompañe el cuidado de su construcción. Igualmente, el secretario de Infraestructura agregó que de forma paulatina se seguirán abriendo los frentes de trabajo para completar el total de 42 equipos

avanzando en la ejecución de este megaproyecto urbano y de infraestructura, el cual beneficiará a miles de Laboyanos de las 4 comunas de la ciudad.

De esta manera, la Administración Municipal adelanta una quinta parte del total de cuadras para la pavimentación en los 74 sectores de la zona urbana de Pitalito, labores que se continuarán realizando en todas las comunas durante las próximas semanas.



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región que Vive

# CONSTRUCCION CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

|                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| CONTRATO OBRA:          | <b>361 de 2021</b>  | EJECUCIÓN  |
| CONTRATISTA:            | CONSORCIO CANCHA SINTETICA PITALITO Y/O MARIA CAROLINA SARMIENTO  | <b>22%</b> |
| CONTRATO INTERVENTORÍA: | <b>417 de 2021</b>  |            |
| INTERVENTOR:            | CONSORCIO INTER VILLA OLIMPICA Y/O JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ   |            |
| OBJETO:                 | CONSTRUCCION CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA |            |
| PLAZO INICIAL:          | SEIS (6) MESES  |            |
| VALOR INICIAL:          | 3.907.097.818   |            |
| FECHA INICIO:           | OCTUBRE 14 DE 2021  |            |
| SUSPENSIÓN No 1:        | DICIEMBRE 28 DE 2021  |            |
| ACTA DE TERMINACIÓN:    |   |            |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN:    |   |            |

## LOCALIZACION



| CUADRO DE AREAS          | M2               |
|--------------------------|------------------|
| <b>AREA A INTERVENIR</b> | <b>19.940,00</b> |
| CANCHA AREA DE JUEGOS    | 7.490,24         |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS    | 3.308,00         |
| GRADERIA PROYECTADA # 1  | 352,40           |
| GRADERIA COMPLEMENTARIA  | 352,40           |
| GRADERIA PROYECTADA # 2  | 352,40           |
| GRADERIA COMPLEMENTARIA  | 352,40           |
| PISTA DE ATLETISMO       | 4.424,00         |
| GRAMA NATURAL            | 3.308,00         |
| <b>AREA TOTAL:</b>       | <b>19.940,00</b> |

| LEYENDA DE COORDINACIONES   |                                    |
|---|------------------------------------|
|    | CARRAMBAZOS                        |
|   | PISTA ATLETICA EXISTENTE           |
|  | CARRAMBAZOS PROYECTADOS EXISTENTES |
|  | CANCHA DE FUTBOL                   |
|  | ZONA DE CIRCULACION                |
|  | AREA VERDE EXISTENTE               |
|  | GRADERIA                           |
|  | ARBOLES                            |



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región **de** Vive

# SUSPENDIDO

ESTADO  
ACTUAL:


Actividades de revisión de Diseños  
Iniciales de Obra - Replanteo de Obra  
Análisis Documentación para Adición de  
Recursos para terminación de obras por  
mayores y menores Cantidades



# CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| CONTRATO OBRA:          | 372 de 2021   | EJECUCIÓN |
| CONTRATISTA:            | CONSORCIO PITALITO IT<br>Y/O OSCAR RENAN<br>VELASQUEZ VIGOYA  |           |
| CONTRATO INTERVENTORÍA: | 280 de 2021   |           |
| INTERVENTOR:            | JUAN MANUEL TOBAR<br>MURCIA   |           |
| OBJETO:                 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA |           |
| PLAZO INICIAL:          | NUEVE (9) MESES   | 51%       |
| VALOR INICIAL:          | 2.570.425.933   |           |
| FECHA INICIO:           | SEPTIEMBRE 20 DE 2021   |           |
| ACTA DE TERMINACIÓN:    |   |           |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN:    |   |           |



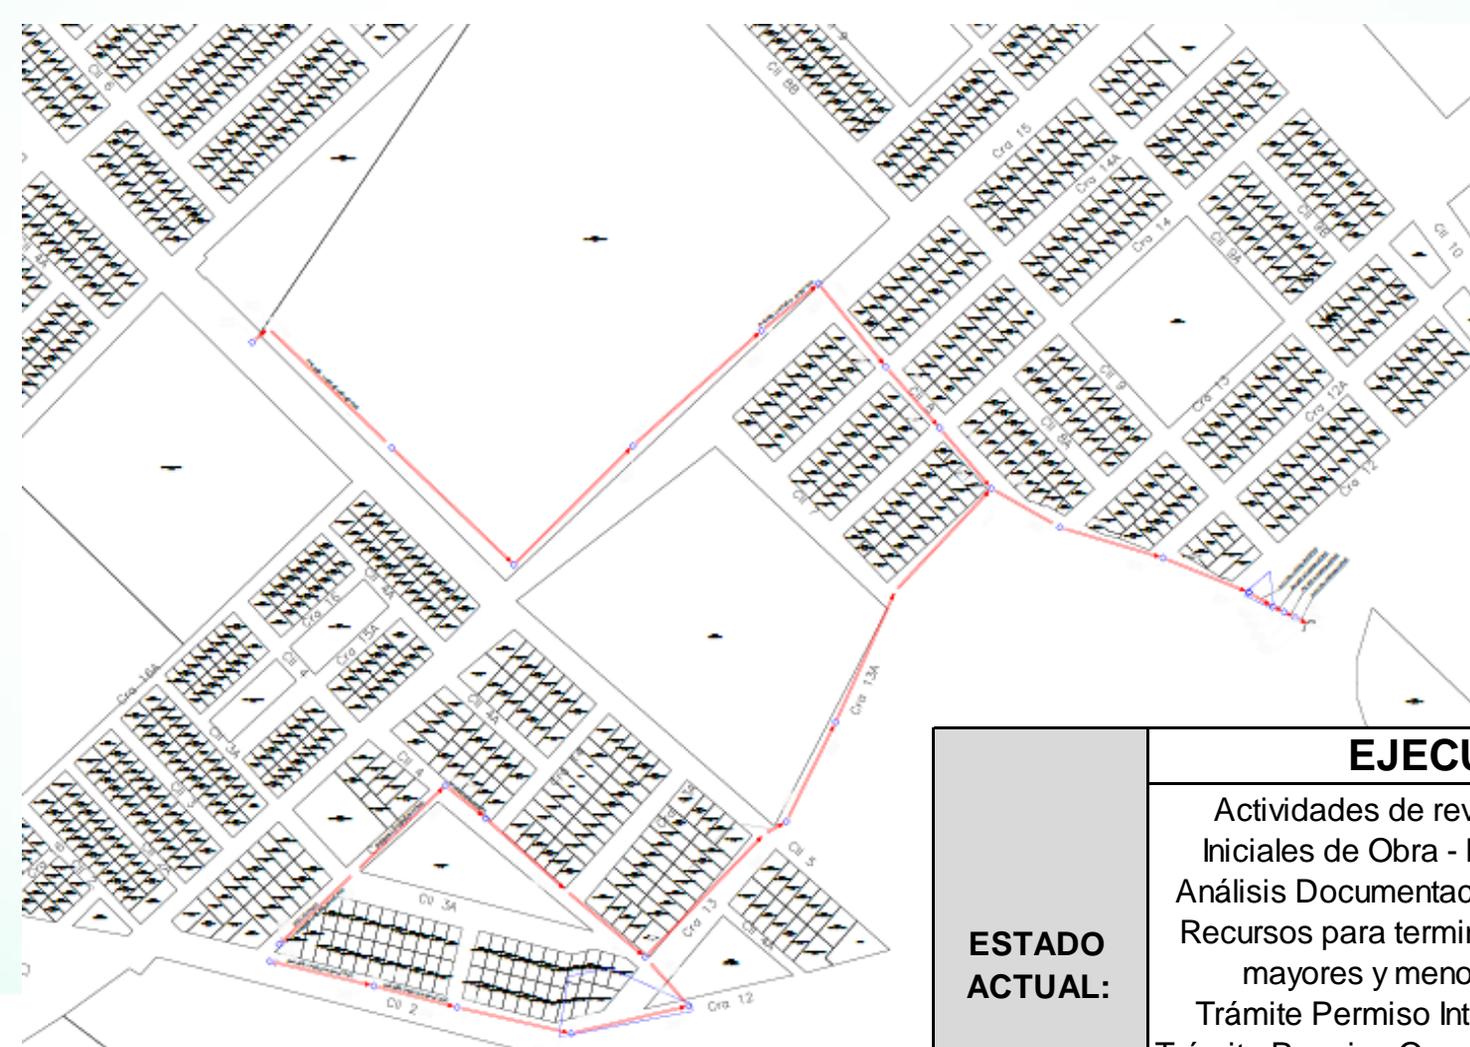


## EJECUCIÓN

### ESTADO ACTUAL:

Actividades de revisión de Diseños  
Iniciales de Obra - Replanteo de Obra  
Análisis Documentación para Adición de  
Recursos para terminación de obras por  
mayores y menores Cantidades  
Trámite Permiso Intervención Vias ANI  
Trámite Permiso Ocupación de Cauce CAM  
Trámite Permiso Aprovechamiento Forestal  
CAM  
Demolición Caseta Villa Olímpica



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila

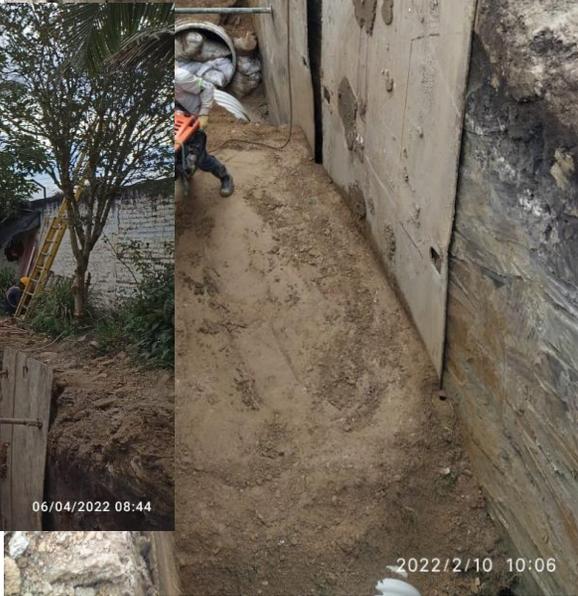

Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)



# ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PITALITO (BRISAS DEL GUARAPAS COMUNA 1) HUILA

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| CONTRATO OBRA:          | 384 de 2021   | EJECUCIÓN |
| CONTRATISTA:            | CONSORCIO SACÚDETE PITALITO Y/O MARILUZ VARGAS GONZALES   | 7%        |
| CONTRATO INTERVENTORÍA: | 368 de 2021   |           |
| INTERVENTOR:            | JUAN MANUEL TOBAR MURCIA  |           |
| OBJETO:                 | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PITALITO (BRISAS DEL GUARAPAS COMUNA 1) HUILA |           |
| PLAZO INICIAL:          | SEIS (6) MESES  |           |
| VALOR INICIAL:          | 1.124.860.000   |           |
| FECHA INICIO:           | SEPTIEMBRE 29 DE 2021   |           |
| SUSPENSIÓN No 1:        | DICIEMBRE 20 DE 2021  |           |
| REINICIO No 1:          | DICIEMBRE 30 DE 2021  |           |
| SUSPENSIÓN No 2:        | DICIEMBRE 30 DE 2021  |           |
| ACTA DE TERMINACIÓN:    |   |           |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN:    |   |           |








# ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PITALITO (BRUSELAS) HUILA

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| CONTRATO OBRA:          | 411 de 2021   | EJECUCIÓN |
| CONTRATISTA:            | UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE BRUSELAS Y/O OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS   | 15%       |
| CONTRATO INTERVENTORÍA: | 375 de 2021   |           |
| INTERVENOR:             | CONSORCIO INTERSACUDETE BRUSELAS Y/O JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ   |           |
| OBJETO:                 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PITALITO (BRUSELAS) HUILA |           |
| PLAZO INICIAL:          | SEIS (6) MESES  |           |
| VALOR INICIAL:          | 1.124.997.520   |           |
| FECHA INICIO:           | SEPTIEMBRE 29 DE 2021   |           |
| SUSPENSIÓN No 1:        | DICIEMBRE 20 DE 2021  |           |
| REINICIO No 1:          | DICIEMBRE 30 DE 2021  |           |
| SUSPENSIÓN No 2:        | DICIEMBRE 30 DE 2021  |           |
| REINICIO No 2:          | ABRIL 18 DE 2022  |           |
| ACTA DE TERMINACIÓN:    |   |           |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN:    |   |           |







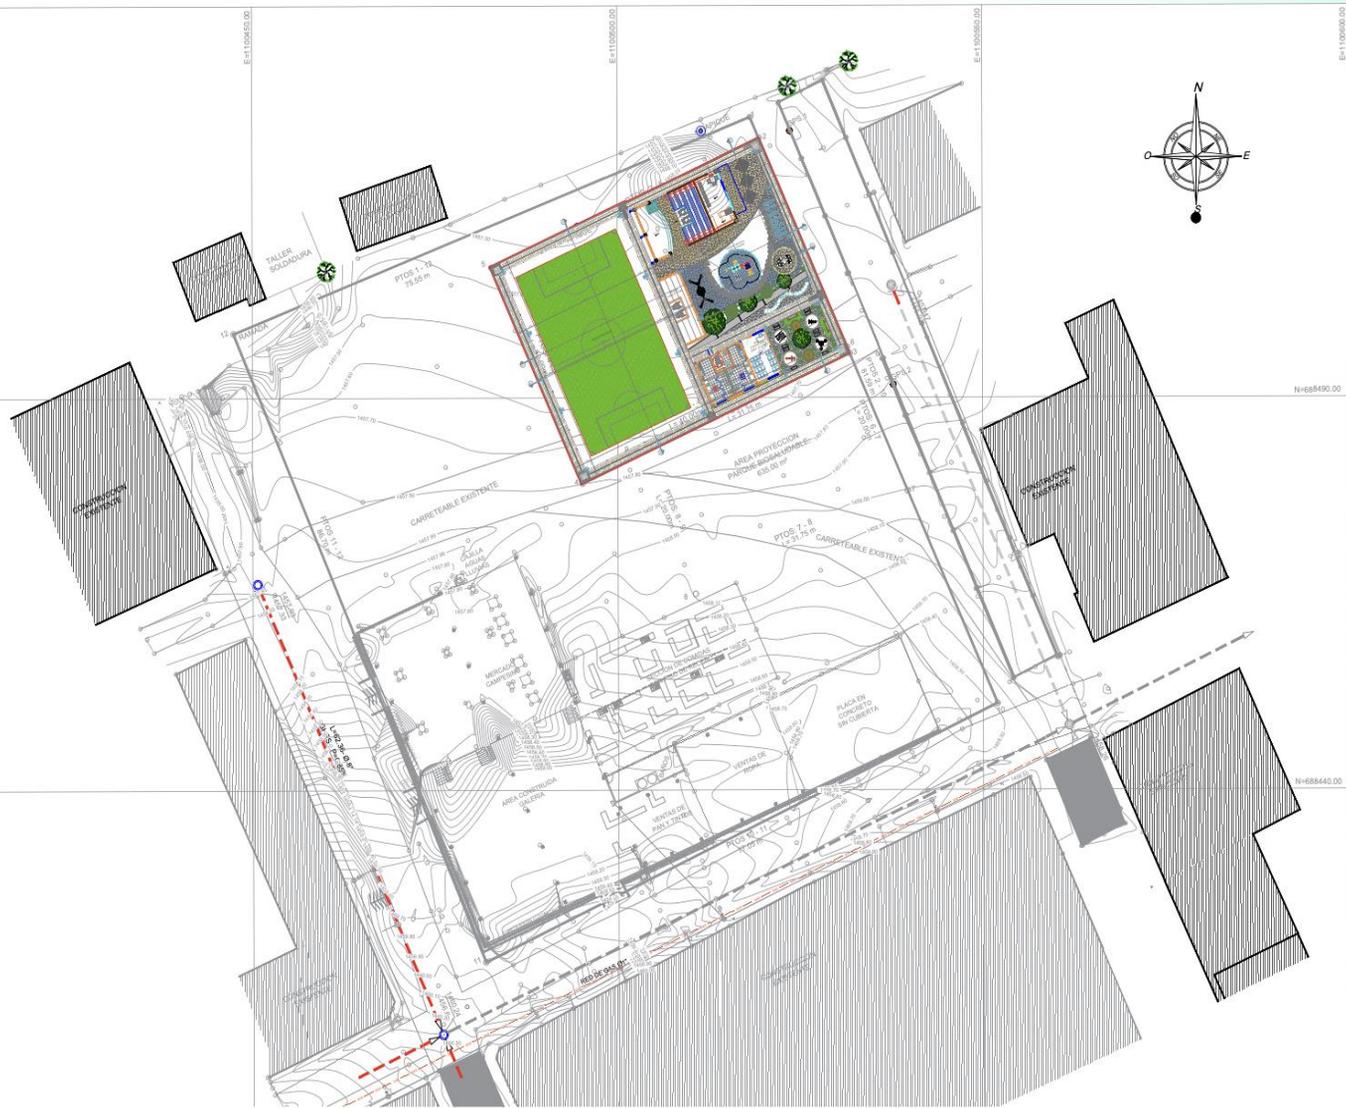



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



# CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN VÍAS DEL CENTRO POBLADO DE BRUSELAS, CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

| No              | DIRECCION                    | BARRIO               | Longitud (m)  | Ancho (m) | Area Total (m2) |
|-----------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 1               | CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7 | BARRIO VILLA DEL RÍO | 63.00         | 5.00      | 315.00          |
| 2               | CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 5 | BARRIO CENTRO        | 365.80        | 8.00      | 2,926.40        |
| 3               | CARRERA 2 ENTRE CALLES 3 Y 7 | BARRIO CENTRO        | 365.47        | 6.00      | 2,192.82        |
| <b>3 TRAMOS</b> |                              |                      | <b>794.27</b> |           | <b>5,434.22</b> |

| ITEM | UBICACIÓN                    | BARRIO               | CUADRAS  |
|------|------------------------------|----------------------|----------|
| 1    | CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7 | BARRIO VILLA DEL RÍO | 1        |
| 2    | CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 5 | BARRIO CENTRO        | 4        |
| 3    | CARRERA 2 ENTRE CALLES 3 Y 7 | BARRIO CENTRO        | 4        |
|      |                              |                      | <b>9</b> |



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila

|  |                         |              |
|--|-------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL DPS | \$ 1.069.442.690        | CONVENIO 343 |
| MUNICIPIO DE PITALITO                  | \$ 83.129.035           | MADURACIÓN   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>\$ 1.152.571.725</b> |              |

Región que Vive

# MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍA Terciaria BAJO SOLARTE - TABACAL - BETANIA – LUCITANIA, DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE OBRAS DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1892 DE 2020 "COLOMBIA RURAL



|  |                   |
|--|-------------------|
| SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA: SECCIÓN 1 + SECCIÓN 2 + SECCIÓN 3 + SECCION 4= (A) | \$ 548.942.455,00 |
| OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)                    | \$ 4.678.830,00   |
| VALOR BÁSICO OBRA (A+B) = (C)  | \$ 553.621.285,00 |
| VALOR BÁSICO ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA - SECCIÓN 5 = (D)                    | \$ 22.166.987,00  |
| VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%*D) = (E)                           | \$ 4.211.728,00   |
| VALOR TOTAL = (C+D+E)  | \$ 580.000.000,00 |



# MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Terciarias DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS YANDAKI-EL ROSAL, INTILLAGTA Y RUMIYACO, QUE ESTAN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE OBRAS DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1348 DE 2021 "COLOMBIA RURAL"



| DEPARTAMENTO                          | MUNICIPIO | TERRITORIO  | Presupuesto        |
|---------------------------------------|-----------|---|--------------------|
| HUILA                                 | PITALITO  | YANDAKI - EL ROSAL  | 131.374.293        |
| Descripción meta física del contrato: |           | Construcción de 1 alcantarilla<br>Construcción de 45 ml de placa huella<br>Construcción de box culvert 2x2<br>Construcción de 60 ml de filtro                     |                    |
| HUILA                                 | PITALITO  | INTILLAGATA   | 173.916.735        |
| Descripción meta física del contrato: |           | Construcción de 1 alcantarilla<br>Construcción de 99 ml de placa huella<br>Construcción de 1 disipadores de energía de L= 20m<br>Construcción de 170 ml de filtro |                    |
| HUILA                                 | PITALITO  | RUMIYAKO  | 161.872.972        |
| Descripción meta física del contrato: |           | Construcción de 2 alcantarillas<br>Construcción de 112 ml de placa huella<br>Construcción de 2 disipadores de energía de L= 10m                                   |                    |
| <b>VALOR TOTAL PRESUPUESTOS:</b>      |           |   | <b>467.164.000</b> |



# APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS EN PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO

## CONVENIO 036 DE 2021 – GASIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSIDIO AL DERECHO DE CONEXIÓN A LA RED DE GAS DOMICILIARIO DE USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN ZONA URBANA Y RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - BPIN 2021004410004

Suscrito entre Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P. , Gobernación del Huila y los municipios de COLOMBIA, GUADALUPE, IQUIRA, ISNOS, LA ARGENTINA, OPORAPA, LA PLATA, PITAL, PITALITO, SALADOBLANCO, SAN AGUSTIN, SUAZA, TIMANA

## AVANCE DE EJECUCIÓN: 20%

|              |   |                   |                         |                         | CONVENIO 036/2021            |                       |                         |
|--------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|              |   |                   |                         |                         | SUBSIDIO DERECHO DE CONEXIÓN |                       | INSTALACION INTERNA     |
|              |   |                   |                         |                         | \$ 270,869                   | \$ 406,303            | \$ 853,694              |
| MUNICIPIO    | VEREDAS   | USUARIOS PROYECTO | VALOR TOTAL PROYECTO    | VALOR INFRAESTRUCTURA   | MUNICIPIO                    | GOBERNACION           | SURGAS                  |
| PITALITO     | BARRIO PALMITAS   | 435               | \$ 761,693,077          | \$ 95,766,367           | \$ 117,827,928               | \$ 176,741,892        | \$ 371,356,890          |
|              | SANTA FE, BOMBONAL, PRIMAVERA Y EL CARMEN-BRUSELAS                          | 250               | \$ 827,193,874          | \$ 444,477,374          | \$ 67,717,200                | \$ 101,575,800        | \$ 213,423,500          |
|              | PUERTO LLERAS   | 26                | \$ 86,440,811           | \$ 46,638,295           | \$ 7,042,589                 | \$ 10,563,883         | \$ 22,196,044           |
|              | CHARGUAYACO, PARAISO DE CHARGUAYACO, LAURELES, HONDA-PORVENIR, BARRANQUILLA | 491               | \$ 1,639,317,237        | \$ 887,662,031          | \$ 132,996,581               | \$ 199,494,871        | \$ 419,163,754          |
|              | TIGRE   | 95                | \$ 328,382,105          | \$ 182,949,835          | \$ 25,732,536                | \$ 38,598,804         | \$ 81,100,930           |
|              | RAICITA   | 43                | \$ 153,590,668          | \$ 87,763,430           | \$ 11,647,358                | \$ 17,471,038         | \$ 36,708,842           |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>1,340</b>      | <b>\$ 3,796,617,772</b> | <b>\$ 1,745,257,332</b> | <b>\$ 362,964,192</b>        | <b>\$ 544,446,288</b> | <b>\$ 1,143,949,960</b> |
|              |   |                   |                         |                         | <b>\$ 2,051,360,440.00</b>   |                       |                         |



# APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS EN PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO

## CONVENIO 093 DE 2021 – 104 BATERÍAS SANITARIAS

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO O RED DE CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA A LA RED DE ALCANTARILLADO CON ENFOQUE DIFERENCIAL DIVIDIDO EN SEIS (6) ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

### AVANCE DE EJECUCIÓN: 5%

#### CONTRATISTA:

Consortio Huila Sur Uno.

R. Legal: Zulma Jazmín Rubio Monroy.


Contrato 085 de 2022

#### INTERVENTORÍA: Julio

Leandro Garzón

Alfonso

Contrato 105 de 2022.

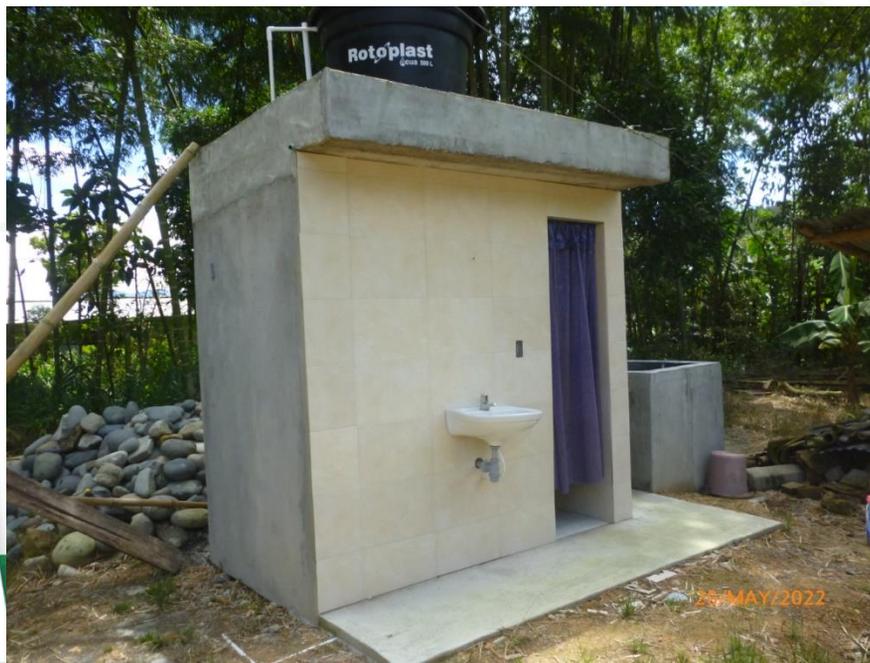

#### APOORTE MUNICIPIO:

\$592.800.000

Fuente: SGR 2021

#### APOORTE DEPARTAMENTO:

\$3.734.950.793

Fuente: Recursos Propios

#### APOORTE AGUAS DEL HUILA:

\$2.100.000.000

Fuente: Recurso Estampilla



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila

Región de Vive

# ALTOS DEL GUADUAL I VIVIENDA GRATIS

4 APARTAMENTOS x PISO  
5 PISOS x TORRE  
7 TORRES

140 apartamentos

70 Población Desplazamiento

70 Población Riesgo

Avance general (20/05/2022):  
96,65%



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



alcaldiapitalito

# ALTOS DEL GUADUAL II MI CASA YA

6 APARTAMENTOS x PISO  
5 PISOS x TORRE  
12 TORRES

360 apartamentos

300 de 2 habitaciones

60 de 3 habitaciones

6 apartamentos para discapacitados

Avance general (20/05/2022):

98,03%



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



alcaldiapitalit

**7 ■ Relacione el horario de los operadores de maquinaria amarilla, planillas de pago en lo corrido del presente año y si se ha cancelado recursos por horarios extras y detallarlos.**

**Anexo No 5. Historial de Pagos**

# 8 ■ Informe detallado sobre el avance del Anillo vial Turístico del Sur.

Región que Vive



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región que Vive

# Anillo vial Turístico del Sur


El Anillo Turístico del Sur lo compone la vía Nacional-Pitalito-San Agustín, San Agustín-Estrecho –Obando, Obando-Isnos, Isnos-Bordones, Bordones-La Laguna –Guacacallo, Guacacallo-Cruce ruta 45 y el Cruce Isnos-San Agustín –Altos de los Ídolos.

De acuerdo con la información entregada sobre el avance del Proyecto denominado Anillo Vial Turístico del Sur, es importante afirmar que según la Gobernación del Huila, se tienen dispuestos una inversión de \$58.000 millones para el mejoramiento del corredor vial, Anillo Turístico del Sur del Huila, en el que el departamento invierte con recursos de regalías \$28.000 millones y la nación \$30.000 millones.

Por lo anterior, este proyecto de articulación entre el Plan de Desarrollo “Huila Crece” y el Plan Nacional de desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” tiene como objeto macro el de “aunar esfuerzos para la atención de vías regionales en el departamento del Huila con obras de mejoramiento en el marco del programa para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0”.



# Anillo vial Turístico del Sur

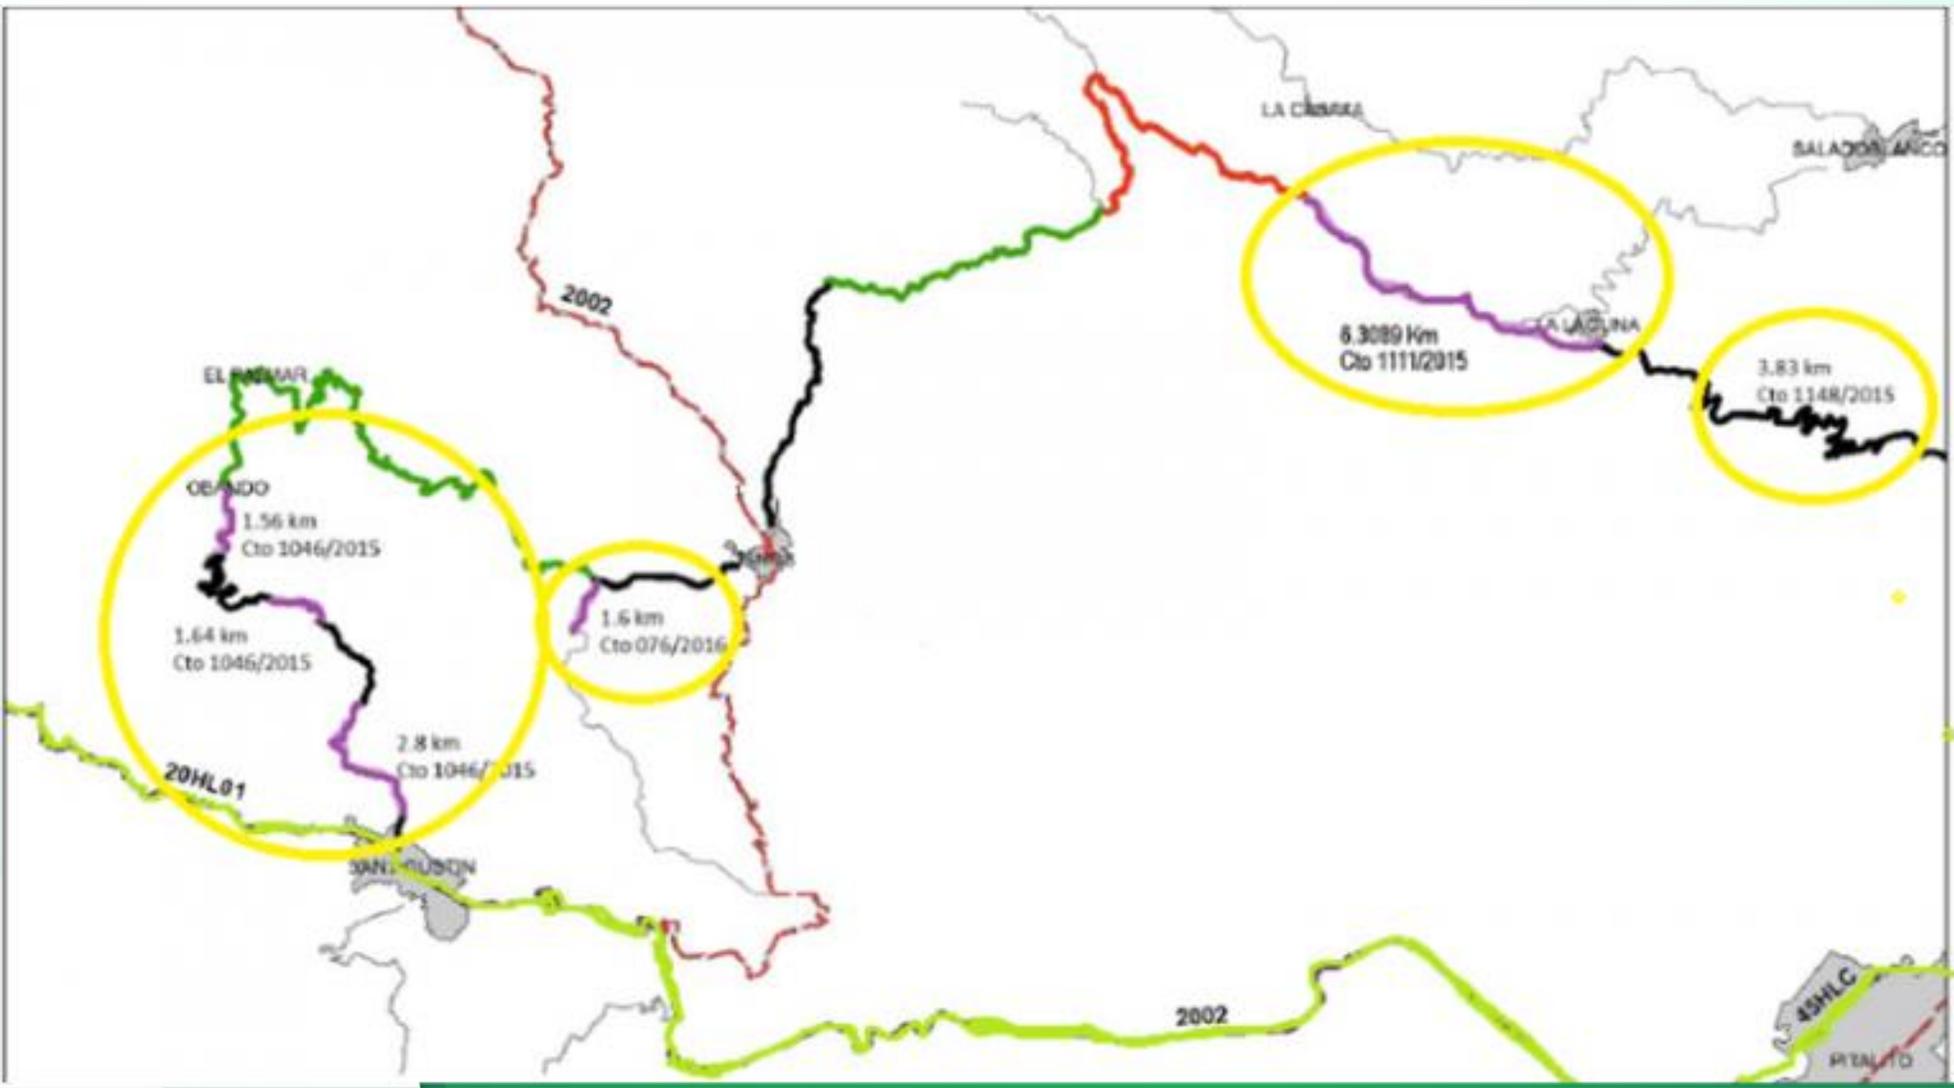

# Anillo vial Turístico del Sur


En cuanto al contrato No 1111 de 2015, suscrito por la Gobernación del Huila, se tiene información de su ejecución que avanza en un 65 % de Avance de obra, sin embargo, de acuerdo a la comunidad del sector se han presentado varios inconvenientes en cuanto al rendimiento y ejecución de la obra que la secretaría de infraestructura del municipio revisó y pudo encontrar algunas observaciones que se anexan para la revisión del Concejo Municipal.

Adicionalmente se hace parte del equipo de seguimiento a la obra en ejecución, en donde el Municipio quiere realizar acompañamiento a la buena ejecución y terminación de la obra.

**Se adjunta Anexo No 6. Informe SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OBRA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA ANILLO VIAL TURÍSTICO DEL SUR EN EL TRAMO QUE CONDUCE DEL CENTRO POBLADO DE LA LAGUNA A LA VEREDA ARRAYANES DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA**



# Anillo vial Turístico del Sur

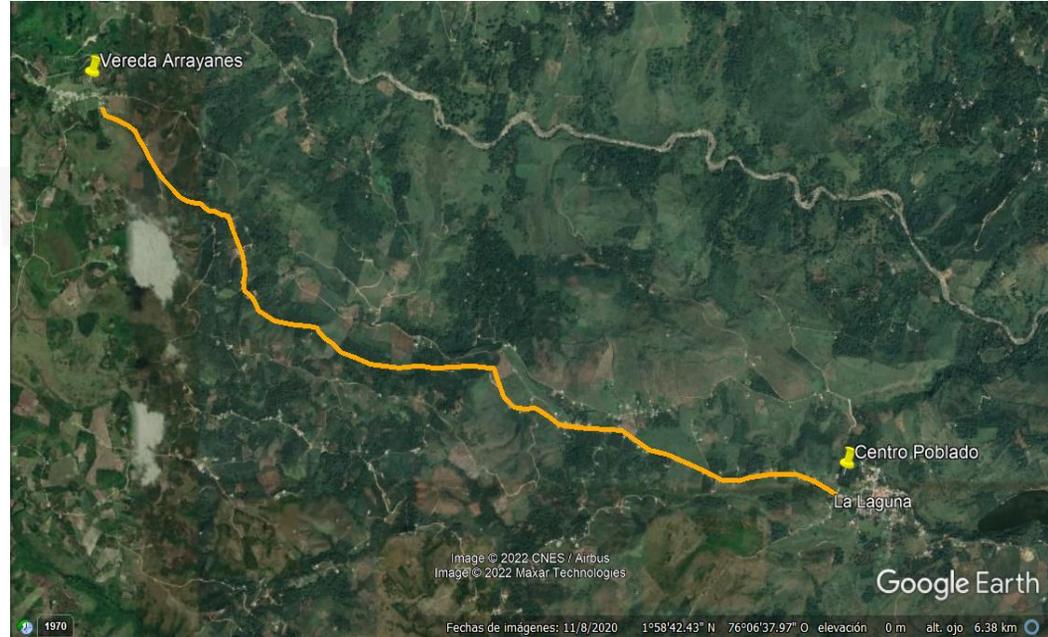

Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región de Vive

# Anillo vial Turístico del Sur

| No tramo | Longitud Aproximada | Distancia referencia  | Observaciones  |
|----------|---------------------|---|--|
| 1        | 2 kms               | Del Centro Poblado – kilómetro 2 aprox.                             | Terminado<br>Ejecución total de obra de pavimentación, con alcantarillas, cunetas y carpeta asfáltica ya en funcionamiento y rodadura al tránsito vehicular.   |
| 2        | 1.5 kms             | Del Punto de Referencia Kilómetro 2 aprox – kilómetro 3.5 aprox.    | Parcial – Avance Alto<br>Ejecución parcial de obra de pavimentación, con alcantarillas, cunetas parcialmente y carpeta asfáltica en construcción, con la instalación de una capa de concreto asfáltico, con necesidad de instalación de la siguiente capa de rodadura para tener el nivel final de la capa de concreto asfáltico para su terminación y puesta en funcionamiento. |
| 3        | 1.0 kms             | Del Punto de Referencia Kilómetro 3.5 aprox. – kilómetro 4.5 aprox. | Parcial – Avance Medio<br>Ejecución parcial de obra de pavimentación, con actividades de construcción de alcantarillas, cunetas e instalación de carpeta de subbase granular sin instalación de carpeta asfáltica.   |
| 4        | 2.0 kms             | Del Punto de Referencia Kilómetro 3.5 aprox. – kilómetro 6.5 aprox. | Parcial – Muy Poco Avance<br>Poco avance de obra, vía en estado sin intervención en cuanto a la estructura de pavimento.   |



# Anillo vial Turístico del Sur



# Anillo vial Turístico del Sur



# Anillo vial Turístico del Sur

## 1. Calidad de las obras terminadas

- Realizar una revisión técnica en el sector que ha presentado desniveles y encharcamientos por falta de desagüe por cunetas perimetrales.
- Se deben analizar la posible corrección y mejoramiento en el terminado y acabado de las obras terminadas de cunetas, muros de contención y alcantarillas, por las consideraciones de funcionabilidad, estabilidad y calidad de las obras terminadas.

## 2. Calidad en la ejecución de las obras

- Se requiere mayor supervisión, verificación e inspección de la ejecución de las obras, mayor presencia de la interventoría técnica y mejoramiento en las consideraciones de obra que posibiliten mayor calidad y mejor terminado de obras, así como avance.
- Se requiere una mejor señalización y presencia de parte de contratistas en cuanto a seguridad en movilización y en cuanto a frentes de trabajo para ejecución de obra.

## 3. Cumplimiento Contractual

- Se requiere que los contratistas realicen jornadas de reunión con la comunidad para garantizar que no se presenten acciones de incumplimiento a permisos de intervención con propietarios, pagos a personal de la obra y acciones sociales de la obra en cumplimiento a lo que se haya acordado con la comunidad del sector.

## 4. Verificación de Avance de Obra y Alcance del Proyecto

- Se solicita de manera muy importante la socialización por parte de la gobernación del Huila y la Secretaría de Infraestructura del Departamento, en liderar reuniones de aclaración del alcance de la obra, sus problemáticas y soluciones para garantizar que la obra avance mucho más rápido, eficientemente y con la calidad requerida para terminar totalmente la obra.



# 9 ■ Informe de los proyectos presentados por su secretaría a nivel Nacional y Departamental para proyectos de placa huella y/o pavimentación y el estado actual de dicha gestión.



# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- **Proyectos Agua Potable y Saneamiento Básico**
  - Proyecto Ampliación y Optimización Sistema de Alcantarillado Sanitario del Corregimiento de Bruselas Hacia la vereda Santa Fé del Municipio de Pitalito, departamento del Huila
  - Proyecto de eliminación de vertimientos de sistema de alcantarillado de Bruselas en sector Puente Cabeceras.
  - Alcantarillado de aguas lluvias en la comuna cuatro (4) del Municipio de Pitalito.
  - En Estructuración, para realización de diseños hidrosanitarios:
    - Alcantarillado Santa Helena
    - Acueducto Cabeceras Holanda El Limón
    - Alcantarillado Aguas Lluvias El Tesoro

# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- **Elaboración en Convenio con Aguas del Huila S.A. E.S.P.**
  - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO RURAL SECTOR MACAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
  - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS, DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
  - CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL, SEIS (6) VEREDAS CORREGIMIENTO CRIOLLO
  - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RESGUARDO INDÍGENA YANAKONAS-RUMIYACO DEL CORREGIMIENTO CRIOLLO DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- Proyecto de Construcción de Placa Huellas – Unidad de Víctimas

| CÓDIGOS | CÓDIGO | DEPARTA | MUNICIPIO | DANE  | CODIFICA      | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  |
|---------|--------|---------|-----------|-------|---------------|---|
| 5693    | 5693   | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-1062- | Construcción placa huella desde la Iglesia al centro de salud del centro poblado de Guacacallo  |
| 5694    | 5694   | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-1062- | Construcción placa huella parte alta de la vereda Monserrate corregimiento Guacacallo           |
| 6097    | 6097   | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-1064- | Construcción placa huella tramo la Cusumba vía la Florida                                       |
| 6101    | 6101   | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-1064- | Construcción placa huella tramo ingreso laguna verde  |
| 6184    | 6184   | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-1064- | Construcción placa huella vereda arrayanes  |
| 6274    | 6274   | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-1063- | Construcción placa huella vereda la cristalina (alto cristalina ) del corregimiento de Bruselas |
| 11927   | 11927  | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-1064- | Construcción placa huella tramos ingreso al cementerio  |
| 11928   | 11928  | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-1064- | Construcción placa huella tramo ingreso al colegio centro Poblado la Laguna                     |
| 11929   | 11929  | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-1062- | Construcción placa huella vereda La Reserva, tramos orilla finca Roberto Parra y cabecera vía   |
| 11940   | 11940  | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-24-20 | Construcción placa huella vereda el Cabuyo parte alta corregimiento Criollo.                    |
| 11941   | 11941  | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-24-20 | Construcción placa huella vereda el Chillurco corregimiento Chillurco vía centro de salud       |
| 11942   | 11942  | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-24-20 | Construcción placa huella vereda el Libano corregimiento Criollo                                |
| 12628   | 12628  | HUILA   | PITALITO  | 41551 | 41551-1-24-20 | Construcción placa huella vereda el Danubio corregimiento Chillurco                             |



# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- Proyectos Eléctricos Diseñados y Formulados

## Proyectos Alumbrado Público

- Vía a Yamboró
- Velódromo
- Cancha Sintética
- Vía a Guacacallo
- Parques y Zonas Verdes
- Polideportivos

| PROYECTOS ELÉCTRICOS DISEÑADOS Y FORMULADOS 2022 |               |   |          |                  |   |
|--|---------------|---|----------|------------------|---|
| Ítem   | Corregimiento | Vereda  | Usuarios | Valor            | Presentado a Entidad                    |
| 1  | Laguna        | Centro Poblado, La Unión, Laguna Verde, Arrayanes, Remolino, Siete de Agosto Y La Florida | 311      | \$ 7.132.261.552 | Fondo FAER - UPME - Min Minas y Energía |
|  | Bruselas      | El Meson y Puerto Lleras  | 55       |                  |   |
|  | Charguayaco   | Santa Ritha   | 65       |                  |   |
| 2  | Criollo       | El Palmar de Criollo  | 23       | \$ 311.008.667   | Gobernación del Huila                   |
| 3  | Bruselas      | El Pensil   | 59       | \$ 1.057.114.042 | Gobernación del Huila                   |
| 4  | Criollo       | El Recuerdo   | 59       | \$ 832.193.877   | Gobernación del Huila                   |
| 5  | Charguayaco   | Divino Niño   | 80       | \$ 1.025.099.564 | Gobernación del Huila                   |
|  |               | Costa Rica  |          |                  |   |
|  |               | Resinas   |          |                  |   |
| 6  | Bruselas      | La Esperanza  | 27       | \$ 404.129.799   | Gobernación del Huila                   |
| 7  | Bruselas      | Lomitas   | 35       | \$ 279.638.458   | Gobernación del Huila                   |
| 8  | Bruselas      | Miraflores  | 37       | \$ 498.021.309   | Gobernación del Huila                   |
| 9  | Bruselas      | Montecristo   | 99       | \$ 1.148.892.961 | Gobernación del Huila                   |
| 10   | Criollo       | Rincon de Contador  | 19       | \$ 105.300.106   | Gobernación del Huila                   |
| 11   | Criollo       | Versalles   | 33       | \$ 413.427.576   | Gobernación del Huila                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| TOTAL USUARIOS                                  | 902               |
| TOTAL VEREDAS                                   | 22                |
| TOTAL CORREMIGIMIENTOS                          | 4                 |
| TOTAL RECURSOS SOLICITADOS GOBERNACIÓN          | \$ 6.074.826.359  |
| TOTAL RECURSOS SOLICITADOS FONDO FAER           | \$ 7.132.261.552  |
| TOTAL RECURSOS NECESITADOS ELÉCTRIFICACIÓN 2022 | \$ 13.207.087.911 |



# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- Proyectos de Inversión para la Gobernación del Huila

| PROYECTOS GOBERNACIÓN DEL HUILA   |              |            |  |
|---|--------------|------------|--|
| NOMBRE  | TIPO DE OBRA | ALCANCE    | ESTADO   |
| PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de pavimentos urbanos en el municipio de Pitalito   | PAVIMENTO    | 27 CUADRAS | RADICADOS ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFÍAS. CONSULTORÍA CONTRATADA POR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA |
| MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO PARA VÍAS DE LOS BARRIOS DE LA COMUNA UNO (1) DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | PAVIMENTO    | 26 CUADRAS | REVISIÓN TÉCNICA DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA SUBSANACIONES MAYO DE 2021<br>Valor: 3.096.875.811                                  |
| PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS HIDRAULICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA  | PAVIMENTO    | 18 CUADRAS | EN ESTRUCTURACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (PARA RADICAR EN MAYO DE 2021)<br>Valor: 2.105.000.000           |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRERA 21 ENTRE LA TRANSVERSAL 20 Y LA CALLE 10 DEL BARRIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA                | PAVIMENTO    | 6 CUADRAS  | RADICADO No 6035 EN LA GOBERNACIÓN DEL HUILA 7 de Abril de 2021<br>Valor: 587.120.174  |

|  |                             |           |  |
|--|-----------------------------|-----------|--|
| MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de placa huella en sitios críticos de los municipios de Pitalito, Palestina y Oporapa del departamento del Huila                  | PLACA HUELLA                | 14 TRAMOS | ALCANCE: 2.200 ML<br>RADICADO EN LA GOBERNACIÓN DEL HUILA<br>EN ESTADO DE APROBACIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL   |
| ADECUACION PLAZA DE MERCADO MINORISTA MUNICIPIO DE PITALITO HUILA  | ADECUACIÓN PLAZA DE MERCADO |           | RADICADO EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA<br>EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES |
| PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE PRINCIPAL DE CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, FASE 3  | PARQUE                      |           | RADICADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA   |
| PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VÍA PITALITO - PALESTINA  | PAVIMENTO                   | 3000 ML   | EN ESTRUCTURACIÓN PARA APORTE MUNICIPIO DE PITALITO  |
| PROYECTO PARA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE AMPLIACIÓN PUENTE SOBRE RÍO GUARAPAS EN LA AVENIDA PASTRANA E INTERCAMBIADOR VIAL EN INTERSECCIÓN CARRERA 3 CON CALLE 3 SUR HOSPITAL DEPARTAMENTAL | DISEÑOS                     |           | EN ESTRUCTURACIÓN  |



# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- Proyectos de Inversión para la Gobernación del Huila



# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

## • Proyectos de Tramos de Placa Huellas

| No. | PROYECTO  | LONGITUD | TRAMOS | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL (\$) |
|-----|---|----------|--------|------------------------|------------------|
| 1   | Mejoramiento de Vías Terciarias con la construcción de tramos de placa huella en la veredas el macal y la Guandinoso del Municipio de Pitalito Huila.   | 1205 ML  | 2      | DPS                    | \$ 2.040.241.845 |
| 2   | Mejoramiento de Vías Terciarias con la construcción de tramos de placa huella en las veredas camberos y albania del corregimiento de criollo del Municipio de Pitalito, departamento del Huila.                                     | 1210 ML  | 3      | DPS                    | \$ 1.982.129.492 |
| 3   | Mejoramiento de vías terciarias con la construcción de tramos de placa huella en veredas de los corregimientos de chaguayaco, criollo, bruselas y guacacayo, mpio Pitalito, dpto Huila OO   | 5000 ML  | 7      | INVIAS                 | \$ 8.695.043.762 |
| 4   | Reformulacion Proyecto "Mejoramiento de vías terciarias con la construcción de tramos de placa huella en veredas de los corregimientos de Chaguayaco, Criollo, Bruselas y Guacacayo, municipio de Pitalito, departamento del Huila" | 1915 ML  | 7      | INVIAS                 | \$ 3.291.795.497 |
| 5   | Proyecto "Mejoramiento de vías terciarias con la construcción de tramos de placa huella en veredas de los corregimientos de chillurco, palmarito, criollo y guacacayo, municipio de Pitalito, departamento del Huila" YM            | 840 ML   | 5      | INVIAS                 | \$ 1.065.953.876 |
| 6   | Proyecto "Mejoramiento de vías terciarias con la construcción de tramos de placa huella en veredas de los corregimientos de regueros, La Laguna y Palmarito, municipio de Pitalito, departamento del Huila MM                       | 1250 ML  | 4      | INVIAS                 | \$ 1.456.975.894 |
| 7   | Proyecto Jairo Muñoz "Mejoramiento de vías terciarias con la construcción de tramos de placa huella en veredas del corregimiento de Bruselas, municipio de Pitalito, departamento del Huila JM                                      | 810 ML   | 3      | INVIAS                 | \$ 1.455.220.252 |

|    |  |         |            |                      |                       |
|----|--|---------|------------|----------------------|-----------------------|
| 8  | Mejoramiento de vías terciarias con la construcción de tramos de placa huella en veredas de los ocho corregimientos del municipio de Pitalito, departamento del Huila  | 2400 ML | 24         | INVIAS               | \$ 4.359.686.946      |
| 9  | Proyecto representante "Mejoramiento de vías terciarias con la construcción de tramos de placa huella en veredas de los corregimientos de Bruselas, Criollo y Regueros, municipio de Pitalito, departamento del Huila" R | 700 ML  | 3          | INVIAS               | \$ 894.384.583        |
| 10 | Proyecto "Mejoramiento de vías terciarias con la construcción de tramo de placa huella en la vereda Moriñal del corregimiento de Regueros, municipio de Pitalito, departamento del Huila" A                              | 500 ML  | 1          | INVIAS               | \$ 856.680.169        |
| 11 | Proyecto "Mejoramiento de vía terciaria con la construcción de un tramo de placa huella en la vereda Hacienda Laboyos del corregimiento de Criollo, municipio de Pitalito, departamento del Huila"                       | 1265 ML | 1          | INVIAS               | \$ 2.198.981.549      |
| 12 | Proyecto "Mejoramiento de vía terciaria con la construcción de un tramo de placa huella en la vereda La Raicita, municipio de Pitalito, departamento del Huila"  | 1000 ML | 1          | INVIAS               | \$ 1.562.267.486      |
| 13 | Proyecto "Mejoramiento de vías terciarias para la conectividad y productividad con la construcción de Placa huellas en veredas del Municipio de Pitalito, departamento del Huila"  | 6000 ML | 38         | INVIAS               | \$ 9.822.000.000      |
| 14 | Placa Huella Vía Chillurco - Proyecto de Mejoramiento de vía terciaria REGIONAL  | 3500 ML | 3          | GOBERNACIÓN - INVIAS | \$ 4.150.000.000      |
|    |  |         | <b>102</b> |                      | <b>43.831.361.351</b> |



# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- Proyectos de Concesión Ruta 45 (PITALITO)



**SITIOS CRÍTICOS PRIORITARIOS PERIODO DE TRANSICIÓN - FASE II**

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

**SITIOS CRÍTICOS NO INTERVENIDOS**


| INTERVENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS  | DISEÑOS              | PRIORIDAD   | ALCANCE             | \$               |
|--|----------------------|-------------|---------------------|------------------|
| Sitio Crítico UF7 P R6+140 Ruta 6301   | DISEÑOS FASE I       | PRIORITARIO | SOLUCION DEFINITIVA | \$ 900.000.000   |
| Sitio Crítico UF5 K 108+800 Ruta 4503  | DISEÑOS FASE I       | PRIORITARIO | SOLUCION DEFINITIVA | \$ 820.000.000   |
| Sitio Crítico UF5 K 71+100 Ruta 4503   | DISEÑOS INICIALES    | PRIORITARIO | SOLUCION DEFINITIVA | \$ 1.008.910.412 |
| Sitio Crítico UF5 K 70+900 Ruta 4503   | DISEÑOS INICIALES    | PRIORITARIO | SOLUCION DEFINITIVA | \$ 527.569.488   |
| Sitio Crítico UF6 K 34+500 Ruta 4503   | DISEÑOS INICIALES    | PRIORITARIO | SOLUCION DEFINITIVA | \$ 1.692.572.101 |
| Sitio Crítico UF6 K 33+600 Ruta 4503   | DISEÑOS INICIALES-AC | PRIORITARIO | SOLUCION DEFINITIVA | \$ 5.576.375.634 |
| Sitio Crítico UF6 K 28+100 Ruta 4503   | DISEÑOS INICIALES    | NO          |                     |                  |
| Sitio crítico puente - Quebrada San Antonio UF6 P R6+100 Estructura provisional RIVIAS |                      | PRIORITARIO | SOLUCION DEFINITIVA | \$ 3.240.000.000 |
| Sitio Crítico UF6 P R3+800 Ruta 4503   | DISEÑOS FASE I       | PRIORITARIO | SOLUCION DEFINITIVA | \$ 750.000.000   |
| Sitio Crítico UF5 K 116+700 Ruta 4503  | DISEÑOS FASE I       | PRIORITARIO | SOLUCION DEFINITIVA | \$ 1.800.000.000 |
| Indígenas  |                      |             |                     | 1.000.000.000    |

Estimación de costos sitios críticos prioritarios \$17.315.427.636

La movilidad es de todos MiEntorpe


# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- Proyectos de Concesión Ruta 45 (PITALITO)

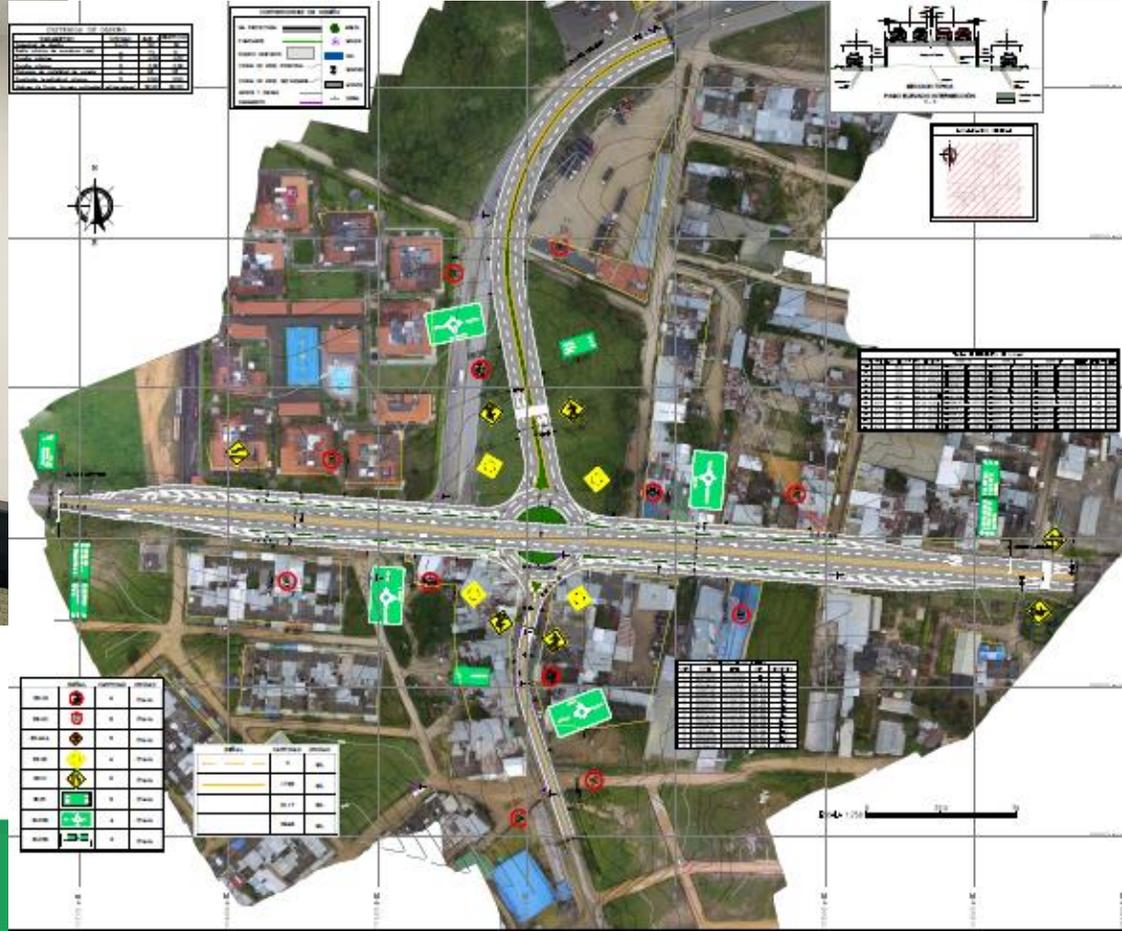


# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- Proyectos de Concesión Ruta 45 (PITALITO)

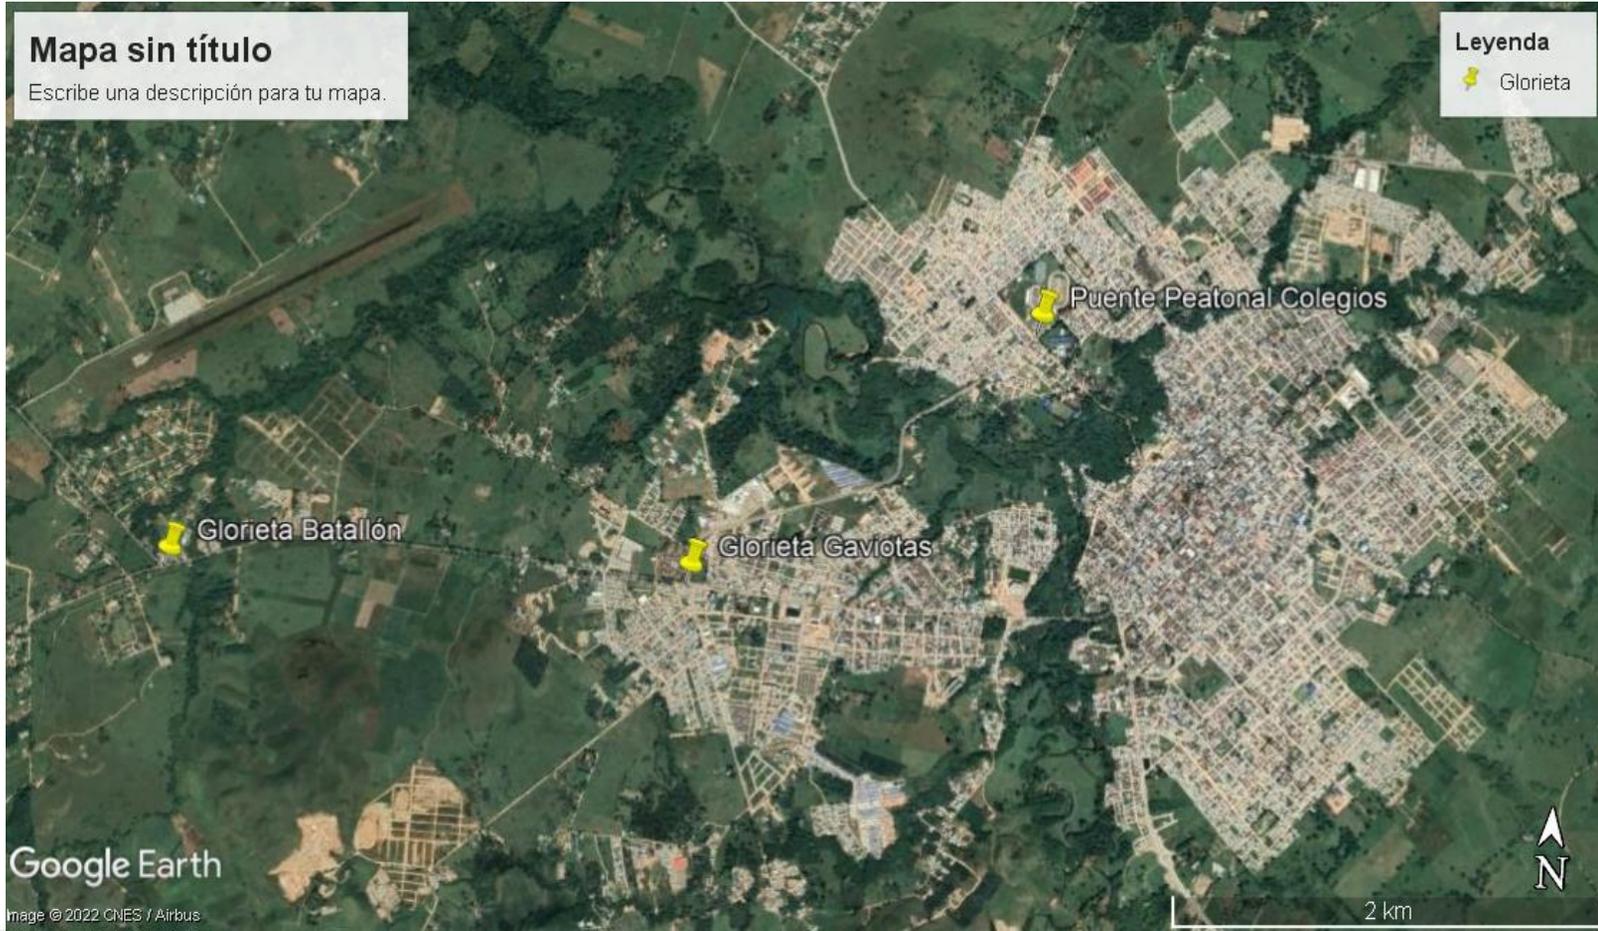

# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- Proyectos de Concesión Ruta 45 (PITALITO)

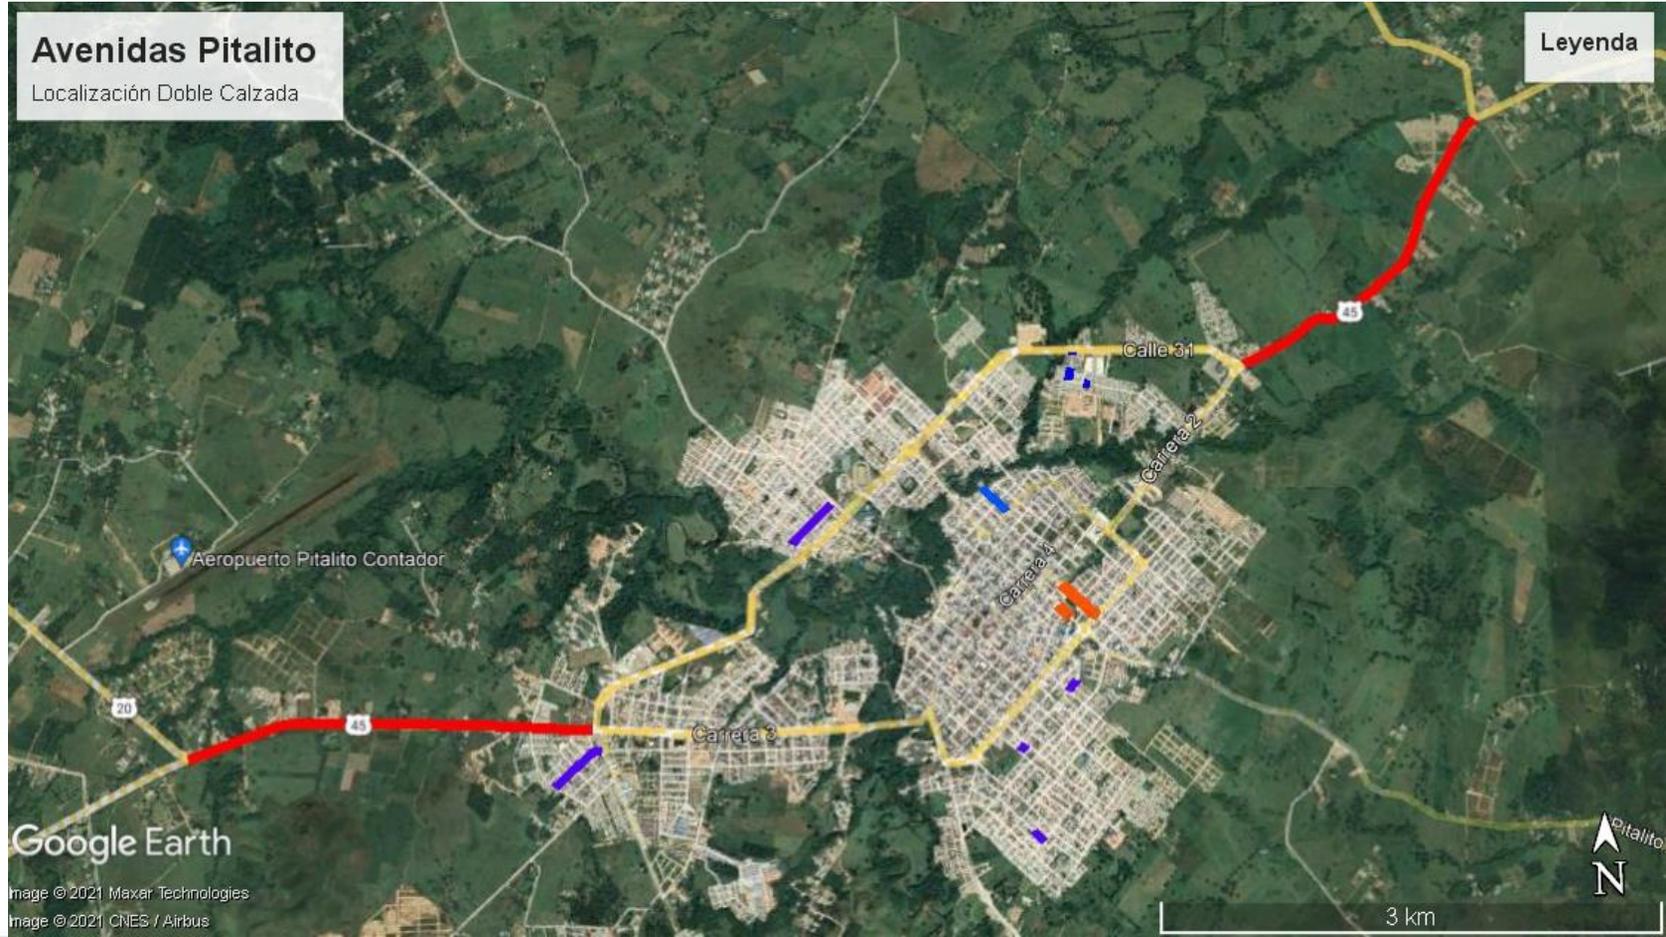

# Gestión, Formulación y Estructuración de Proyectos

- PLAN VIAL MUNICIPAL



# Muchas Gracias

Región que Vive



Alcaldía Municipal  
Pitalito Huila



[alcaldiapitalito.gov.co](http://alcaldiapitalito.gov.co)

Región que Vive
